

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Agosto / 2021



Implantação de iluminação de LED - Bairro Bugio

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano	5
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	6
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	7
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	8
Infraestrutura dos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	9
Infraestrutura do Loteamento Jardim Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas - Bairro Dom Luciano	10
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	11
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio	12
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	13
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	14
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	15
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia	16
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo	17
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria	18
Implementação do novo terminal do mercado - Centro	19
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa	20
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho	21
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa	22
Reurbanização da Praça Prof. Mário Vilas Boas	23
Reurbanização da área contígua a Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont	24
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria	25
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Bairro Mosqueiro	26
Construção da Praça '01' - Bairro 17 de Março	27
Construção da Praça '05' - Bairro 17 de Março	28
Construção da Praça '07' - Bairro 17 de Março	29
Construção da Praça '10' - Bairro 17 de Março	30
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	31
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens - Diversos bairros	32
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus/totens Av. Hermes Fontes/Adélia Franco	33
Revitalização do cercamento do Parque da Sementeira - Jardins	34
Infraestrutura para a Orlinha da Coroa do Meio - 2ª etapa - Coroa do Meio	35
Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim - Farolândia	36
Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida - Santos Dumont	37
Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva - Bairro 18 do Forte	38
Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo - Bairro Ponto Novo	39
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020	40
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021	41
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	42
Resumo de recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	44
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	45
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapeamento/fresagem)	46
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	47
Manutenção (drenagem)	48
Manutenção (serviços diversos)	49
Tabelas de quantitativos	50
3. DIRETORIA DE URBANISMO	54
Implantação de licenciamento digital	55
Quantitativo de saída de processos	56
Instalação de mobiliário urbano	57
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	58
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	59
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março	60
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa	61
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março	62
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	63
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública	65

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.937.618,96

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.



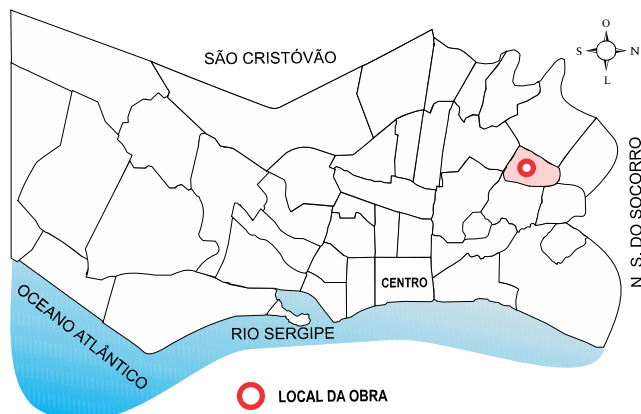

OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 1.129.770,34

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.


A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².



17 de Março

Complementação da construção de maternidade

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

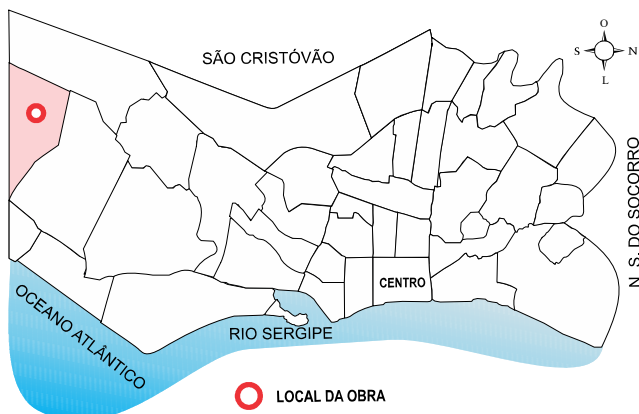


OBRA: Complementação da construção de maternidade


LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 18.079.814,02

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².

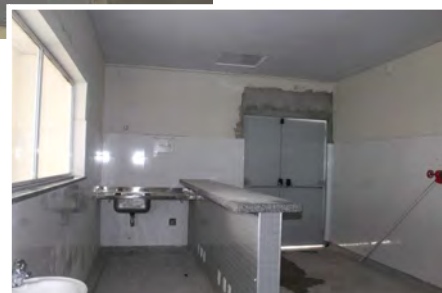

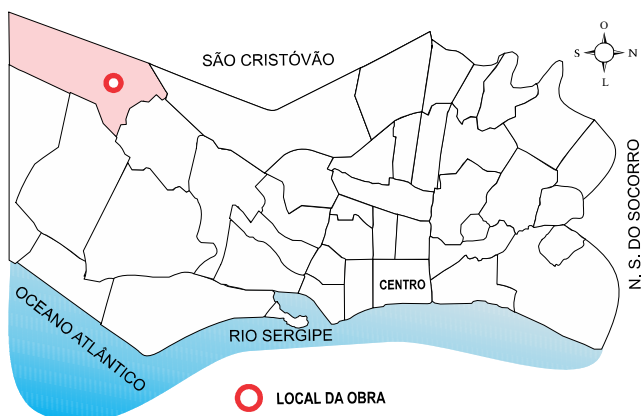

OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.



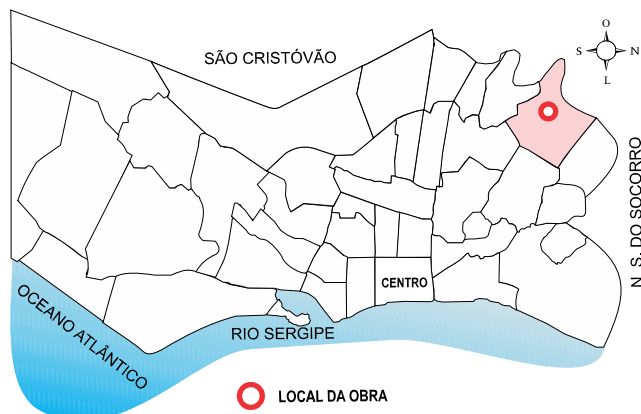

OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 4.769.500,94

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.



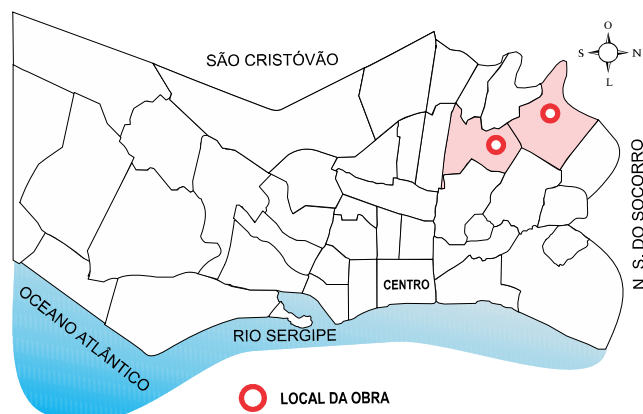

OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.



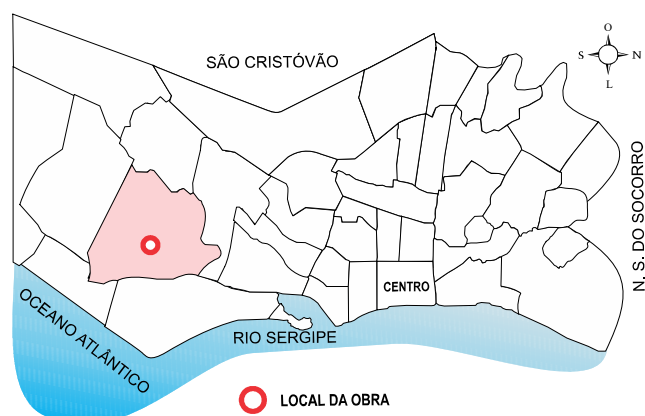

OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade


CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI DR. JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE
Bairro Japãozinho

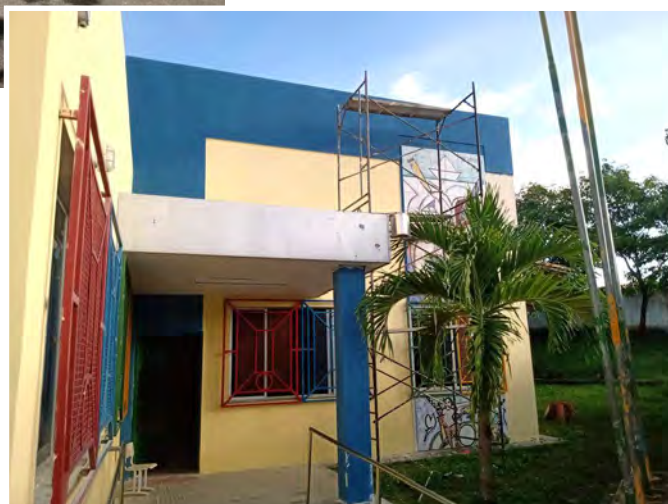




OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.


A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.

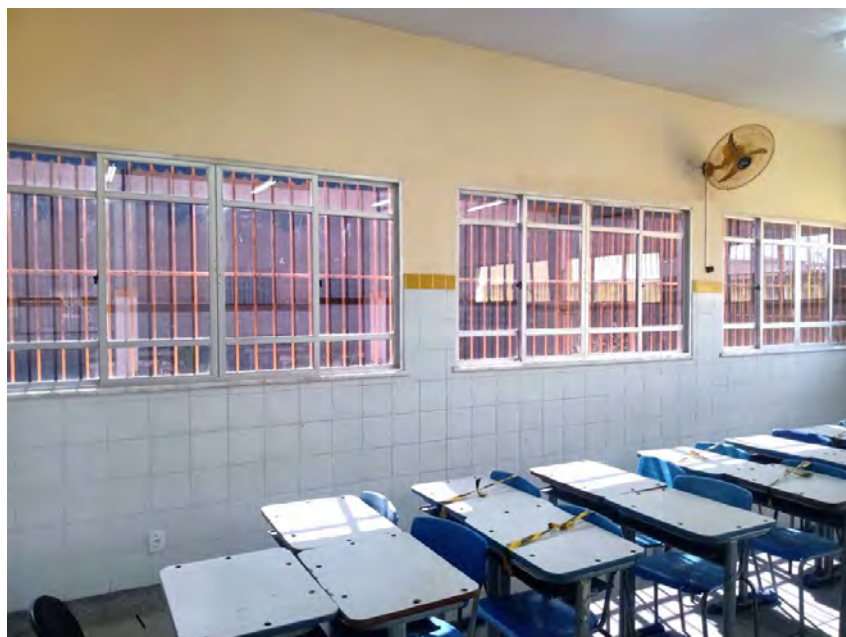

EMEF DEPUTADO JAIME ARAÚJO
Bairro Soledade

EMEI IRENE ROMÃO DE BRITO
Bairro Santa Maria



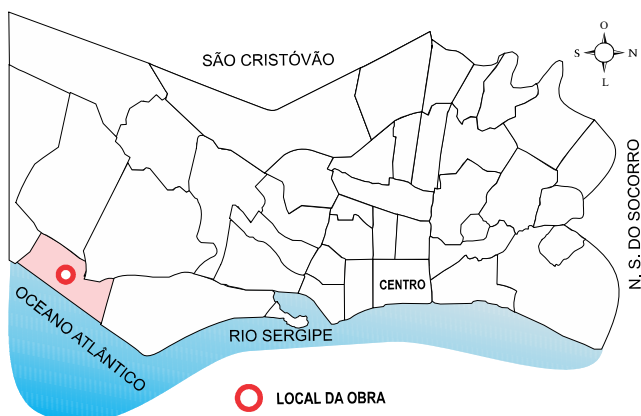

OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 939.364,23

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 704.148,37

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.



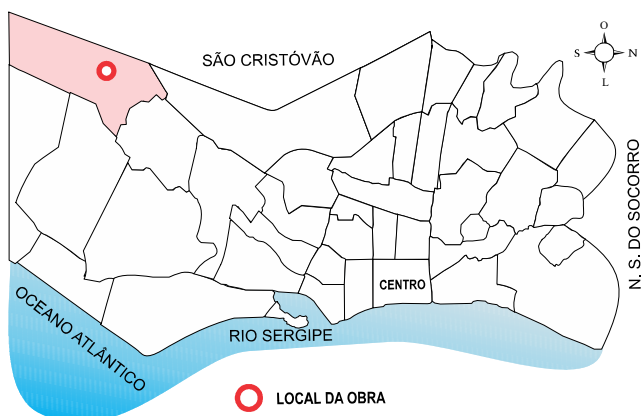

OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado


LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 11.158.882,90

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.



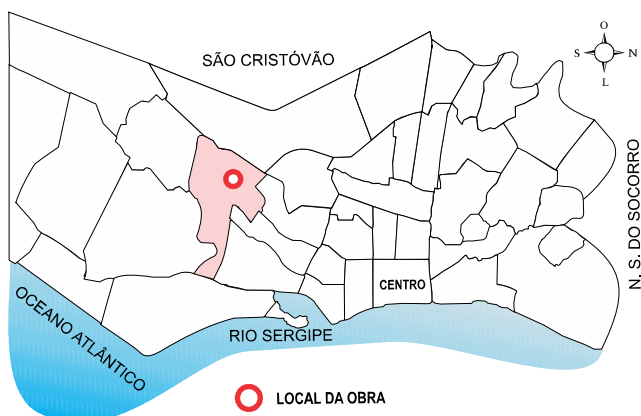

OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.






OBRA: Reurbanização da Praça Professor Mário Vilas Boas


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 138.287,78

EMPRESA: Terra Empreendimentos

A obra consiste na reurbanização da Praça Professor Mário Vilas Boas, no Bairro Ponto Novo.

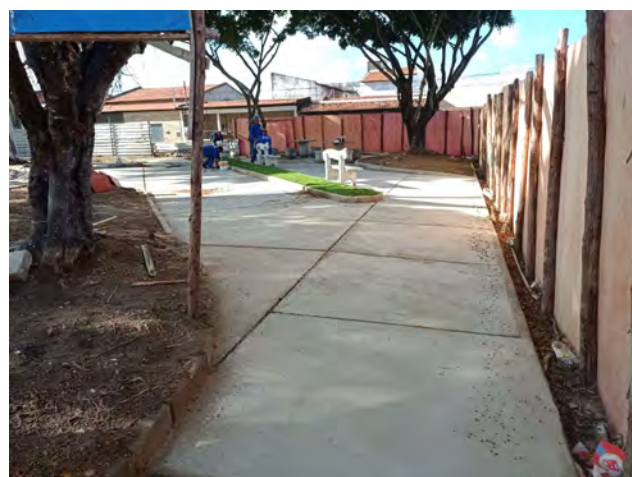

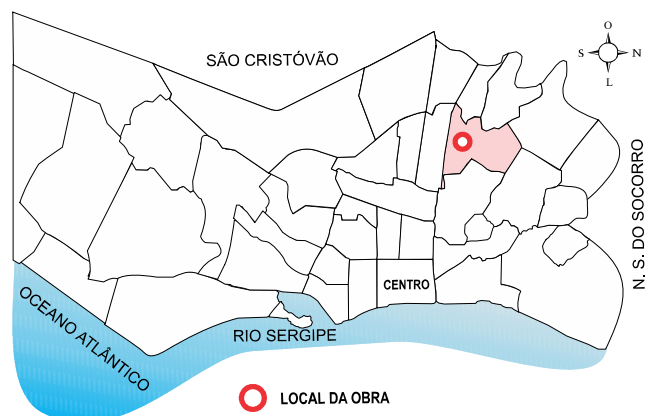

OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.



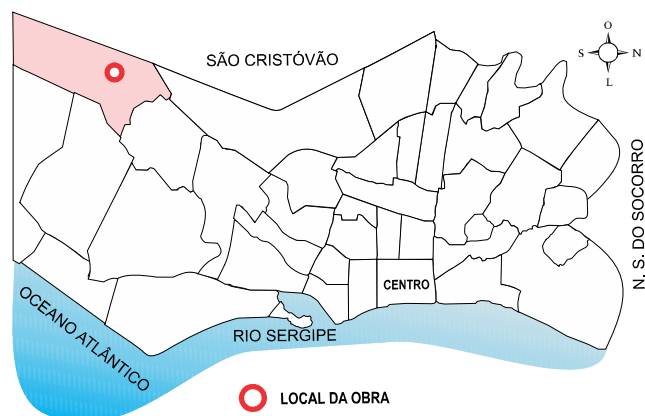

OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas


LOCALIZAÇÃO: Bairro Mosqueiro

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.

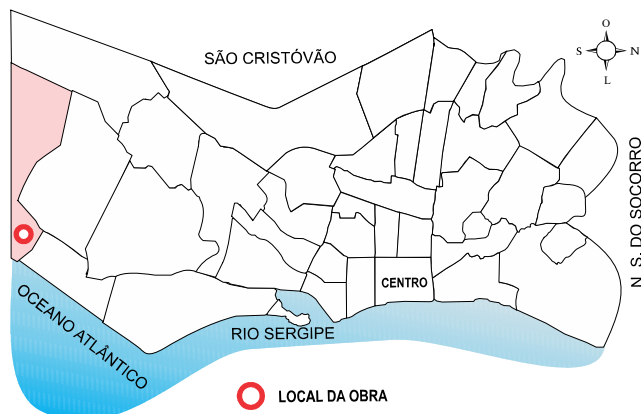

**OBRA:** Construção da Praça '01'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 925.720,38**EMPRESA:** Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '05'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '05'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 568.893,96

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '07'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

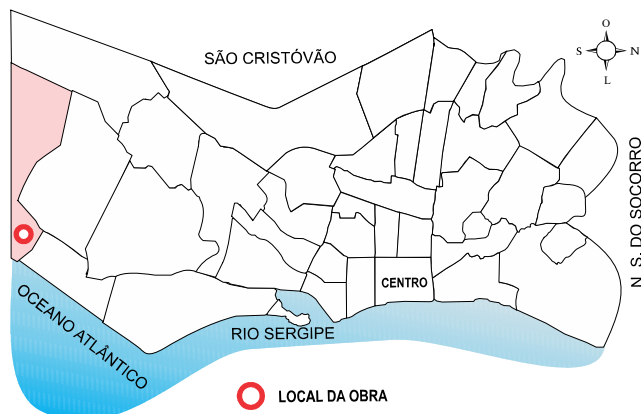

OBRA: Construção da Praça '07'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 872.101,14

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '10'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

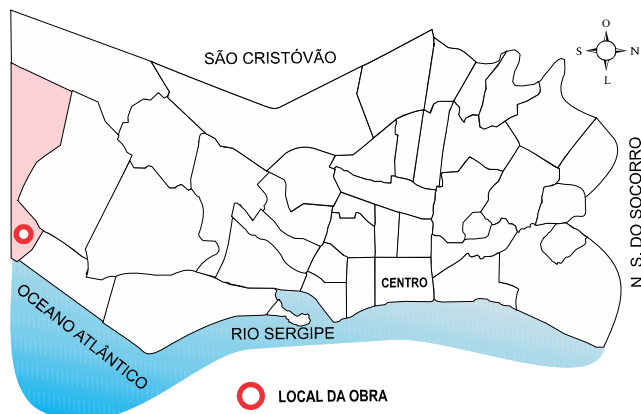

OBRA: Construção da Praça '10'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 500.998,43

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO
Bairro São Conrado



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Siqueira Campos

Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 759.553,57

EMPRESA: Construtora Sol

O contrato consiste no fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco



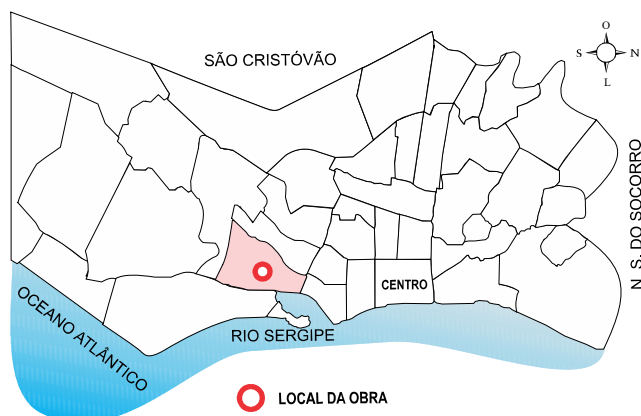

OBRA: Revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 2.540.689,11


EMPRESA: Sercol Engenharia

Obra com recursos do



A revitalização do cercamento e entradas do Parque da Sementeira vai garantir a segurança patrimonial do local e o bem-estar dos frequentadores e pedestres. Será criada uma nova imagem do parque para os cidadãos, reforçando suas características já consolidadas. O projeto reforça a integração do parque com o entorno urbano e marca sua singularidade na paisagem. No novo cercamento será efetuado um recuo em relação ao gradeado atual, visando maior integração dos pedestres, na área externa, com o parque como um todo. Algumas árvores existentes passam a ficar na área externa do parque, contribuindo para a diminuição da sensação de divisão de espaços. Os acessos receberão elementos em concreto de tamanhos variáveis, que estarão dispostos de forma intercalada em um padrão de cores específico para cada entrada, com variação das tonalidades, de acordo com o setor indicado. Já os estacionamentos existentes no entorno do parque passarão por manutenção e revitalização, recebendo também nova sinalização e pintura indicativa. O estacionamento disponível à CCTECA será ampliado.



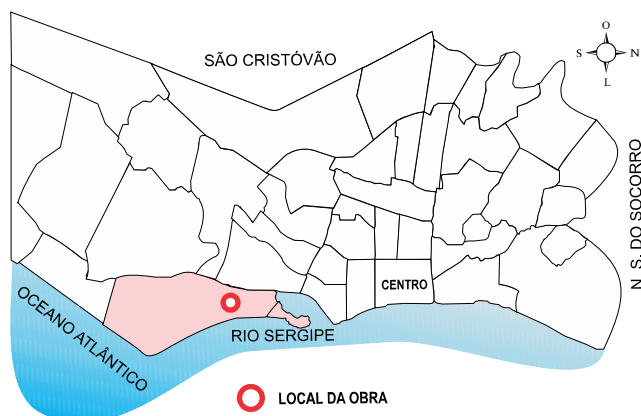

OBRA: Infraestrutura para a Orlinha do Bairro Coroa do Meio - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 4.133.837,94

EMPRESA: Torre Empreendimentos

Nessa 2ª etapa de implantação de infraestrutura na Orlinha da Coroa do Meio, a Prefeitura de Aracaju vai executar uma nova configuração urbanística na região. Serão implantados cerca de 9.700 m² de passeios em concreto, 2.020 m² de ciclovia, pavimentação asfáltica em pouco mais de 21.000 m² e parte do pavimento receberá 1.800 m² de piso intertravado. A nova área urbanizada receberá uma moderna iluminação, rampas de acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. Além disso, será implantada uma rede de drenagem de 720,0 metros e instalações hidrossanitárias.



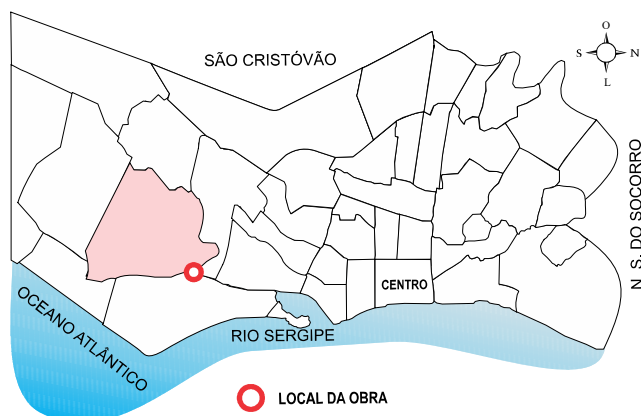

OBRA: Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar


LOCALIZAÇÃO: Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 17.536.642,29

EMPRESA: Procec Engenharia S/A

Inaugurada em 1958, a Ponte Juscelino Kubitschek foi um marco na mobilidade urbana da cidade. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da avenida Beira Mar. A ponte possui 160 m de extensão e as intervenções nos dois lados da ponte serão distintas. Em ambos, será construída uma nova pista de rolamento, com 4,0 m de largura cada. No sentido Centro-Praia, será implantada uma pista para pedestres, uma vez que, no sentido Praia-Centro, já existe pista para pedestre e ciclovia. Nessa obra, serão utilizadas 438 toneladas de aço e mais de 3.000 m³ de concreto. Além disso, serão colocadas 50 estacas de 0,80 m de diâmetro e 45,0 m de profundidade. Quando concluída, a nova ponte terá três faixas de pista de rolamento em cada sentido, com 12,0 m de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres e vai beneficiar a acessibilidade do local, oferecendo mais segurança e conforto aos usuários.



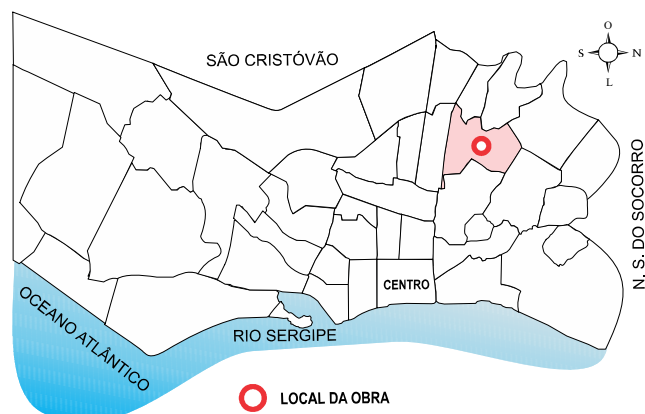

OBRA: Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 631.471,17

EMPRESA: Construtora Camel Ltda.

A obra consiste na construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida.



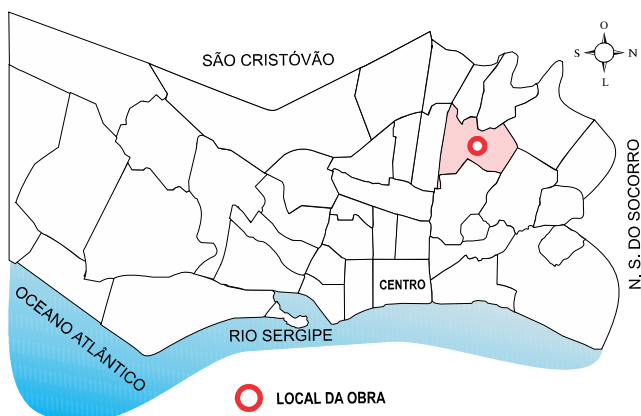

OBRA: Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 2.752.161,06

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

A obra consiste na reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva.





OBRA: Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 315.606,35

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.





- 40

Projetos contratados

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES




Recapeamento / Pavimentação

2017 - 2021


101,42 km


de vias recapeadas / pavimentadas

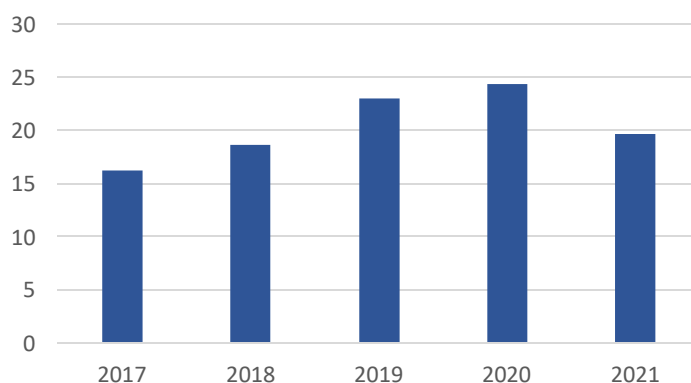


78.694 t

de asfalto aplicado

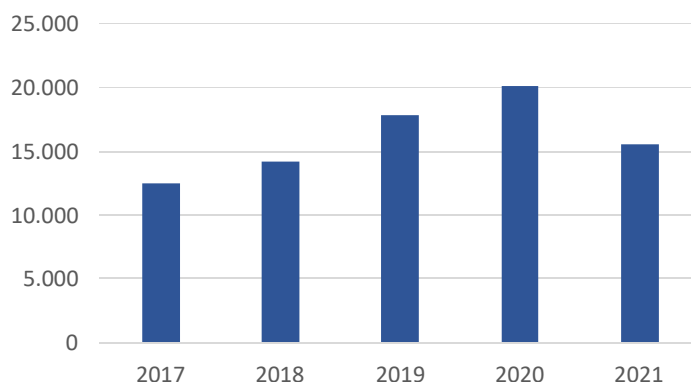

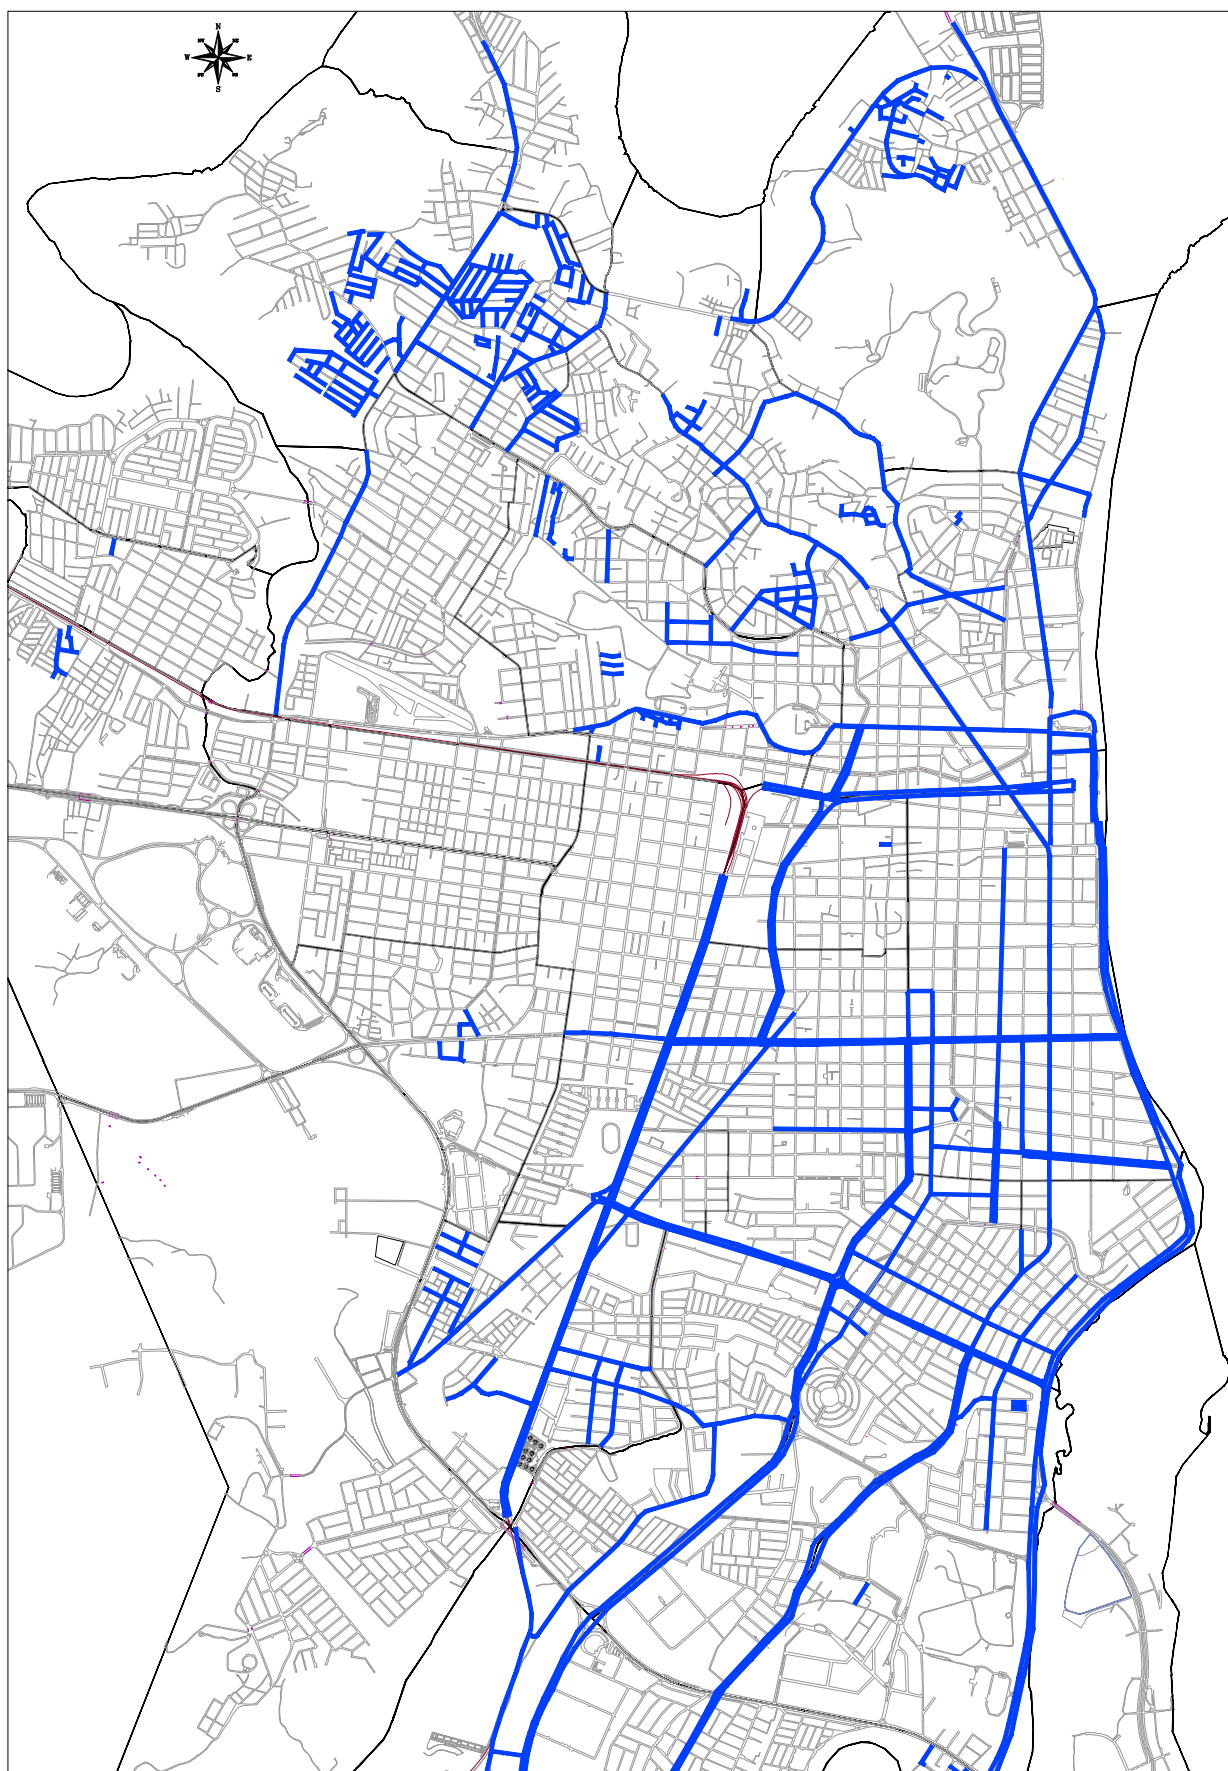


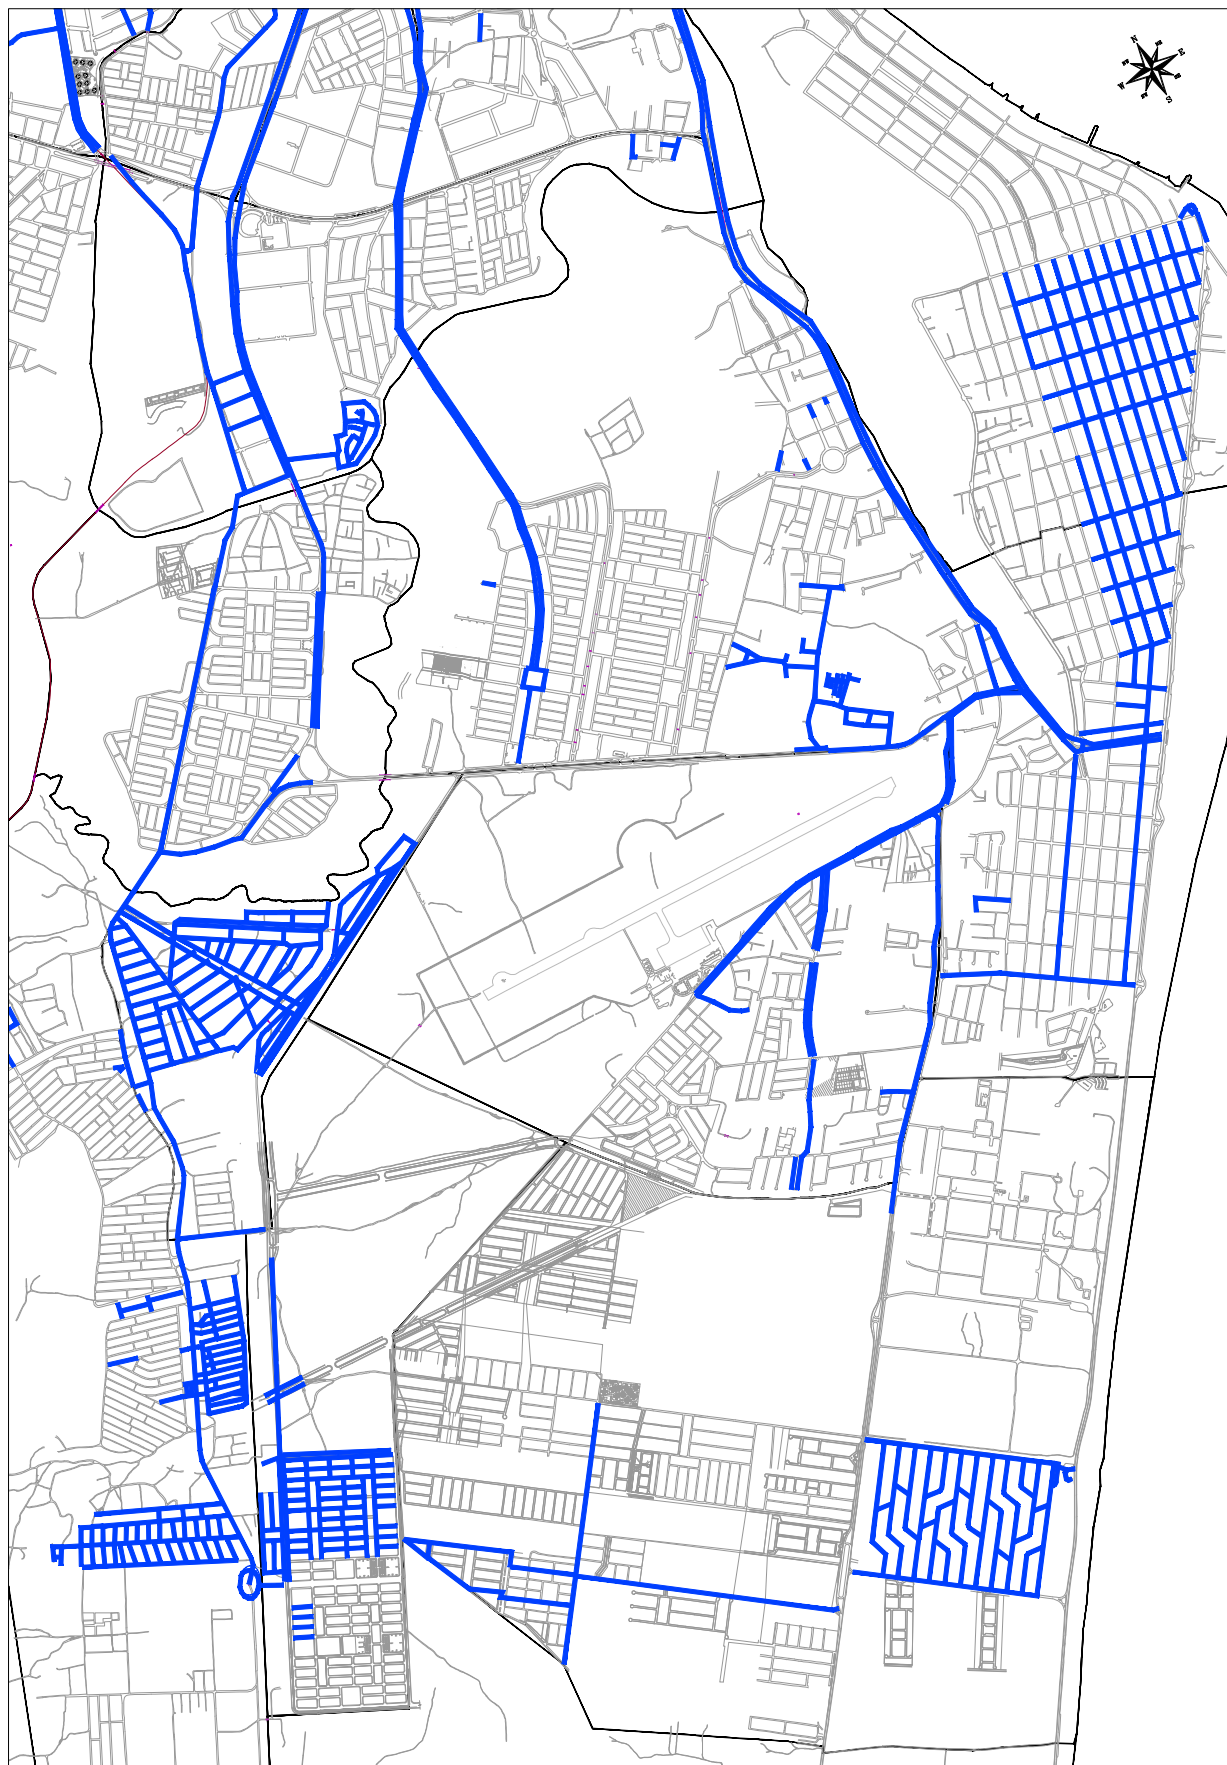

Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo - São José / Cirurgia / Suíssa



Av. Independência - São Conrado

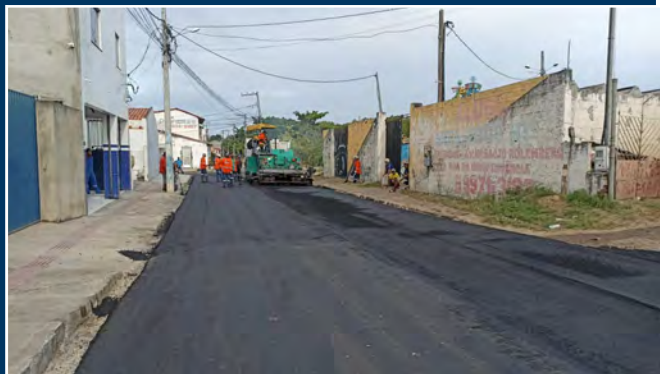


Rua 'G' - Lot. Isabel Martins - Soledade



Rua Valdomiro José de Souza - Dom Luciano



Rua 'Z' - São Conrado

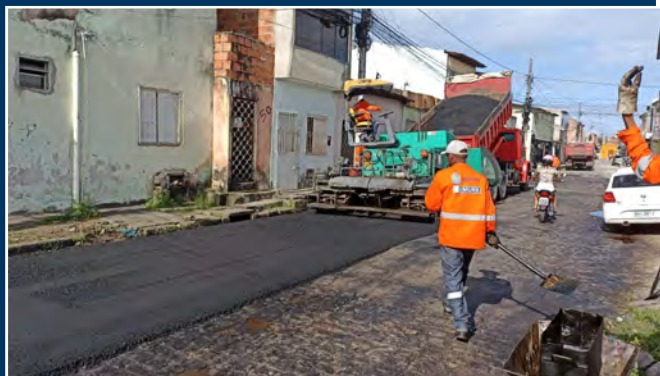

TAPA-BURACOS



Av. Farmacêutica Cezartina Régis - Jabotiana



Av. Tancredo Neves - Inácio Barbosa



Av. Lourival Souza Nery - Olaria



Rua Antônio Dória da Silva - Jabotiana



Rua Gilson Rollemberg - Cj. Santa Tereza - Aeroporto



Rua Orlando Tavares Machado - Aruana



Estrada da Cabrita - Jabotiana



Rua São Vicente - Lot. Jardim Recreio - Santa Maria

Arcos da Orla - Atalaia



Av. Ivo do Prado - Centro



Av. Santos Santana - Jardins



Rua Benjamin Fontes - Luzia



Rua João Barbosa - São Conrado



Rua Jequitibá - Santa Maria



Rua João Nascimento - Ponto Novo



Travessa Raimundo Diniz - Atalaia



Reurbanização da rótula da Av. Nestor Sampaio - Luzia



Implantação de defesa no Canal Comandante Poti - Santos Dumont



Recuperação do Estádio João Hora e da calçada - Siqueira Campos



Recuperação de calçada
da Av. São João Batista
Ponto Novo

Tapa-buraco

BARRIO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENDONÇA COM RUA CARLOS RAMUNDO FONSECA, ATÉ O Nº 462
12 DE JULHO	AVENIDA NINHO AZEVEDO COM RUA LUIZ FALOPES, ATÉ O Nº 348
13 DE JULHO	AVENIDA NINHO AZEVEDO, Nº 348
13 DE JULHO	AVENIDA NINHO AZEVEDO, ENTRE O Nº 309 E O Nº 308
13 DE JULHO	AVENIDA BEIRA MAR, ENTRE O Nº 1190 E AVENIDA FRANCISCO PORTO
18 DO FORTE	TRAVESSA "E", COM RUA RUA VILHADA BASTOS DE ARAÚJO - LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO
18 DO FORTE	TRAVESSA MARCELLO, ENTRE RUA LUIZ RAMOS DA SILVA E AVENIDA LARGO DE BRITO PORTO - LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO
18 DO FORTE	AVENIDA MESSEJES DE MARGALLO, ATÉ A RUA D'ALMEIDA O Nº 11
18 DO FORTE	RUA C, DO Nº 48-ATE O Nº 264 - LOTEAMENTO PORTO RICO
18 DO FORTE	AVENIDA MARMARHÃO, ENTRE O Nº 486 E O Nº 481
AEROPORTO	RUA ROSAMARTINS, ENTRE AVENIDA CANDIDO NACIO E RUA CANAL DE DORÁ LETTE
AEROPORTO	RUA DOS, COM RUA FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONJUNTO LARGO SÃO CONRADO
AEROPORTO	RUA JORNALISTA FERNANDO DE SOUZA, ENTRE RUA DOS E RUA MANOEL BELO - CONJUNTO LARGO SÃO CONRADO
AEROPORTO	RUA MANOEL BELO, ENTRE RUA JORNALISTA FERNANDO DE SOUZA E RUA VINHIA BELO DALL'Z - CONJUNTO LARGO SÃO CONRADO
AEROPORTO	RUA JOSE GURATO DOS SANTOS, ENTRE RUA MANOEL BELO DOS SANTOS E RUA LUIZ DA SILVA - CONJUNTO LARGO SÃO CONRADO
AEROPORTO	RUA LUIZ LUIZ DA SILVA, ENTRE JOSE GURATO DOS SANTOS E RUA VINHIA BELO DALL'Z - CONJUNTO LARGO SÃO CONRADO
AEROPORTO	RUA OLSON ROLEMBERG, ENTRE RUA CARLOS ALEXANDRE DE JESUS E RUA JURY, 207 JELYES MIMES - CONJUNTO SANTA TEREZA
AEROPORTO	TRAVESSA DEPUTADO RAMUNDO DINIZ
AMERICA	RUA MAPA CORALINA PARAIBA, ENTRE A RUA ACRIE
AMERICA	AVENIDA DR. JOSE DA SILVA REBELO FILHO, COM RUA NOVOPARAIBA, ATÉ A RUA ACRIE
AMERICA	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE AVENIDA CAMILO CALZADIS E RUA RIO GRANDE DO SUL
AMERICA	RUA ACRIE, ENTRE O Nº 1266 E O Nº 1224
AMERICA	RUA MAPA CORALINA ACRIE, ATÉ O Nº 487
AMERICA	AVENIDA DR. JOSE DA SILVA REBELO, ENTRE O Nº 435 E O Nº 447
AMERICA	AVENIDA PROFESSOR JOSE OLINDO DE LIMA NETO, COM AVENIDA TANCREDO NEVES, ATÉ A RUA ACRIE
AMERICA	AVENIDA PROFESSOR JOSE OLINDO DE LIMA NETO, ENTRE A RUA ACRIE ATÉ AVENIDA TANCREDO NEVES
AMERICA	RUA NITEL, ENTRE O Nº 516 E O Nº 519
AMERICA	RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 570
ARUANA	RUA ORLANDO TAVARES MACEDO, ENTRE AVENIDA MARIA VASCOELOS DE ANDRADE E O Nº 911
ARUANA	RUA ORLANDO TAVARES MACEDO, ENTRE RODOVA DOS NÚRAGOS E O Nº 891
ATALAIA	AVENIDA MANOEL BANDEIRA, Nº 157
ATALAIA	RUA ALMEIDA ANTONIO DE PAIVA, COM AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL
ATALAIA	AVENIDA HADETE FALCÃO BATISTA, COM AVENIDA EMPREASO JOSE CARLOS SILVA
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, DO Nº 133 ATÉ O Nº 119
BUGIO	RUA C, ENTRE O Nº 275 E O Nº 125
BUGIO	RUAAH - 3, ENTRE O Nº 178 E O Nº 125
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, ENTRE O Nº 177 E O Nº 161
BUGIO	RUA B - 3, DO Nº 25 ATÉ AVENIDA POÇO DO MIO
BUGIO	LARGO JOAO MALUNDO, ENTRE RUA CARDO NALDO GOMES DA SILVA E RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA
BUGIO	RUA CARDO NALDO GOMES DA SILVA, ENTRE AVENIDA POÇO DO MIO E LARGO JOAO MALUNDO
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, ENTRE LARGO JOAO MALUNDO E AVENIDA POÇO DO MIO
BUGIO	RUA E - 2, DO Nº 96 ATÉ AVENIDA CENTENARIO
BUGIO	AVENIDA CENTENARIO, ENTRE O Nº 271 E O Nº 191
BUGIO	RUA C, ENTRE O Nº 716 E O Nº 91
BUGIO	RUA F - 4, ENTRE O Nº 716 E O Nº 93
BUGIO	RUA GENY DA SILVA DROS, ENTRE AVENIDA CENTENARIO E O Nº 1167
CAPICHO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE AVENIDA MARCELO RODRIGUEZ ROBERTO RUIO BRUNCO
CAPICHO	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ENTRE ALCA HAVEN E AVENIDA ALEXDES FONTES
CAPICHO	ROTTA DA AVENIDA MINICHEL RODONON
CAPICHO	CENTRO ADMINISTRATIVO
CAPICHO	AVENIDA DE CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, ENTRE AVENIDA MARCELO RODRIGUEZ ROBERTO RUIO BRUNCO
CAPICHO	AVENIDA DE CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, ENTRE O BARRAM E AVENIDA ALEXDES FONTES
CAPICHO	RUA LUIZA FERREIRA DE MATOS, COM AVENIDA CHAVELIER DOVALDO ANJARA
CAPICHO	TERMINAL DE REGISTAGAO DA PRACA JOAO XOS
CENTRO	AVENIDA PEDRO CALZADIS, ENTRE AVENIDA COLAR E CAMPOS E RUA PIAVIRA PASTORA
CENTRO	AVENIDA MIMES PARES TENENCOZA, ENTRE AVENIDA PEDRO CALZADIS E AVENIDA ANTON TELES
CENTRO	TERMINAL DO MERCADO
CIADDA NOVA	RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA, ENTRE RUA SANTA TEREZA E RUA SÃO FRANCISCO
CIADDA NOVA	RUA SÃO FRANCISCO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA E RUA D'ALMEIDA O Nº 38
CIADDA NOVA	RUA JOAO BATISTA, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA E RUA SÃO CARLOS
CIADDA NOVA	AVENIDA LARGO DE BRITO PORTO, ENTRE RUA NOSSA SENHORA DA GLORIA E AVENIDA NOSSO PARADO
CIADDA NOVA	AVENIDA ANTONIO TONNEN, ENTRE RUA ESTANISLAU E RUA REBELOFOPES
CIADDA NOVA	RUA ESTANISLAU, DO Nº 157 ATÉ O Nº 1124
CORRADO DO MIO	RUA WILHELMUS SILVA CARVALHO, ENTRE AVENIDA DR. ANTONIO BENEDITO GOMES E O Nº 914
CORRADO DO MIO	AVENIDA CAMPOS, ENTRE O Nº 1226 E O Nº 1161
DOLOMILAO	RUA ENTRE RUA D E RUA E
DOLOMILAO	RUA E, ENTRE RUA D E RUA C
DOLOMILAO	RUA C, ENTRE RUA E E O Nº 31
DOLOMILAO	RUA ALZAGANINS, ENTRE RUA CAPITAO MANOEL GOMES E O Nº 101
DOLOMILAO	RUA B, ENTRE RUA D E RUA C
DOLOMILAO	RUA D, ENTRE RUA B E RUA C
DOLOMILAO	RUA A, ENTRE A RUA G E O Nº 152
DOLOMILAO	ALCA DO VILATO, ENTRE A BR 268 E AVENIDA TANCREDO NEVES
FRANCOISA	RUA "E", ENTRE AVENIDA CARLOS DE AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	RUA "A", ENTRE AVENIDA CARLOS DE AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	RUA AQUILINO MASSENA, ENTRE RUA A - 8 E RUA E - 8
FRANCOISA	AVENIDA MARLO DANTAS, ENTRE O Nº 246 E AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	AVENIDA MARLO DANTAS, ENTRE RUA CARLOS DE SILVA, ENTRE O Nº 1557 E AVENIDA DR. DANIEL TARCISIO DOS SANTOS
FRANCOISA	AVENIDA MARLO DANTAS, ENTRE O Nº 1155 ATÉ AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	RUA GUARAPORA COM AVENIDA JOSE CARLOS SILVA, ATÉ O Nº 178
FRANCOISA	RUA MAR MARRANDES, DO Nº 16 ATÉ AVENIDA CARLOS DE SILVA
FRANCOISA	RUA MAR MARRANDES, DO Nº 16 ATÉ AVENIDA CARLOS DE SILVA
FRANCOISA	RUA ANTONIO FONSECA NETO, ENTRE CANAL D'AL CANAL - 83 - CONJUNTO AUGUSTO FRANCO
FRANCOISA	RUA JOSE ALVES PEREIRA, ENTRE RUA AQUILINO MASSENA E A CANAL D'AL CANAL - 83 - CONJUNTO AUGUSTO FRANCO
FRANCOISA	RUA TENDENTE ROTAU BARTHE, ENTRE RUA "E", ENTRE AVENIDA CARLOS DE SILVA E AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	RUA ALVES PEREIRA, ENTRE RUA AQUILINO MASSENA E AVENIDA MARIA PASTORA
FRANCOISA	RUA E - 8, ENTRE AVENIDA MARIA PASTORA E CANAL 55
FRANCOISA	RUA AQUILINO MASSENA, ENTRE RUA JOSE VIEIRA DE JESUS E RUA F - 8
GETULIO VARGAS	RUA RACHO, ENTRE O Nº 733 E O Nº 721
GETULIO VARGAS	AVENIDA MIMES PARES TENENCOZA, ENTRE AVENIDA CARLOS TAVARES E O Nº 1365
GRASERO	RUA TENDENTE SAMPAIO COM RUA LUIZ ALBERTO, ENTRE AVENIDA PEDRO PARS ABEVIO
GRASERO	

[illegible]

Tapa-buraco total: 26.412,02 m²

Drenagem pluvial

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



LOGRADOURO	BARRIO	SERVICO
Av. Ivo do Prado e/ Av Barão de Maracan	06040001	Limpeza de calçada pública
Av. São João Batista - C/ Castello Branco	Centro	Recapeamento de vias e/ ou
Av. São Luiz da Silva e/ "193"	Ponte Novo	Recapeamento de chicanes e calçada
Av. Jussupê - Residencial Vêda Nova	Desenvolvimento	Recapeamento de vias
Rua "Y" - Loteamento Jardim Indira	Santa Maria	Fornecimento e armazenamento de lâmpada de poste de rede
Av. Mário Jorge Menezes Vieira	Dono Luciano	Substituição dos eletrodutos por concreto
		Fornecimento e armazenamento de meio fio
		Recapeamento de bacia de drenagem
		Recapeamento de bacia de drenagem
		Fornecimento e armazenamento de 01 gralha
		Recapeamento de bacia de drenagem
Rua "Y"	Dono Luciano	Construção de alvenaria de pedra
Rua anal Zuhman	06040001	Limpeza de calçada
Av. São João Batista - C/ Castello Branco	Ponte Novo	Recapeamento de chicanes
Av. São João Batista - C/ Castello Branco	Ponte Novo	Recapeamento de chicanes
Av. Maria M	13 de Julho	Construção de bacia de drenagem
Rua "Y" - Loteamento Jardim Indira	Ponte Novo	Fornecimento e armazenamento de meio fio
Rua "Y" - Rua Nasser Barba de Fátima	Santa Maria	Recapeamento de poste de rede
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Substituição dos eletrodutos por concreto
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São Paulo	Santa Maria	Construção de calçada (concreto desmontado)
Av. São Paulo	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua Hermelinda dos Santos	Imperio Cantarido	Recapeamento de meio fio
Rua São João Batista	Ponte Novo	Limpeza de bacia de drenagem
Rua "Y"	Dono Luciano	Construção de alvenaria de pedra
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Av. São João Batista - C/ Castello Branco	Ponte Novo	Recapeamento de chicanes
Av. São João Batista - C/ Castello Branco	Ponte Novo	Recapeamento de chicanes
Av. Vicente de Moraes nº 1596	Dono Luciano	Limpeza da galinha e calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada
Rua Babalândia	Centro	Fornecimento e armazenamento de lâmpada
Rua anal Helene Capelato	Centro	Recapeamento de calçada
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Av. Santa Glória - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Fornecimento e armazenamento de 01 marco integral
Rua "Y" - C/ Maria do Carmo	Chiaia	Pré-limpeza de bacia de drenagem
Rua Jussupê - Residencial Vêda Nova	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. Augusto Franco	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Av. São João Batista	Santa Maria	Recapeamento de meio fio
Rua "Y" - Loteamento Ta Capuca	06040001	Limpeza de calçada</

[illegible][illegible]

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Edelzio Vieira de Melo	Pereira Lobo	6.562,50	630,00
		Suissa	10.312,50	990,00
02	Rua "Z"	São Conrado	729,17	70,00
03	Travessa "Q1"	São Conrado	833,33	80,00
04	Rua da Independência	São Conrado	937,50	90,00
05	Rua "H"	Soledade	520,83	50,00
TOTAL GERAL			19.895,83	1.910,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	4.150,00
02	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	15,00
TOTAL (t)			4.165,00

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
COROA DO MEIO	RUA NELI CORREIA DE ANDRADE	PATROLAMENTO
DOM LUCIANO	RUA "H"	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	RUA "A"	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	AVENIDA "I", LOTEAMENTO MOEMA MEIRE	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	RUA "A"	TERRAPLANAGEM
JABOTIANA	AVENIDA SIZINO DA ROCHA	PATROLAMENTO
LUZIA	AVENIDA NESTOR SAMPAIO	TERRAPLANAGEM
ROBALO	RUA MARIA DO OURO	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA GUAXUMA	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AVENIDA "C", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	TERRAPLANAGEM
SANTA MARIA	RUA SÃO VICENTE, LOTEAMENTO JARDIM RECREIO	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AVENIDA "C", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	RUA "G", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	AVENIDA "G", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	RETIRADA DE BORRACHUDOS
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO PORTO DO GRINGO	PATROLAMENTO

Desobstrução

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

[illegible][illegible][illegible]

MANUTENÇÃO

Limpeza de Fossas

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BARRIO	LOGRADOURO
17 de Março	Rua 747, esquina com Rua 118, Nº 59
17 de Março	Rua Procurador José Costa Cavalcante
17 de Março	Maternidade Municipal no Bairro 17 de Março.
16 do Forte	Rua Monte Castelo, Nº 383.
16 do Forte	Rua Sargento Nezinho, Nº 265.
16 do Forte	Rua General José Maria, Nº 384.
16 do Forte	Rua General Joaquim Valério, Nº 132.
América	Rua Gabriela, Nº 331.
América Brasileira	Estrada Sonho Meu, Nº 151. Casa A.
Araruama	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 857, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Avenida Rubens Sabino Ribeiro Chaves, Nº 853, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "J", Nº 57, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "I", Nº 68, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "L", Nº 87, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "E", Nº 154, Residência Aquarius I.
Araruama	Rua "1", Nº 910, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "G", Nº 547, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua "L", Nº 111, Residencial Horto do Carvalho.
Araruama	Rua Ariano Suassuna, Nº 131, Residência Aquarius II.
Araruama	Rua Rubem Sabino Ribeiro Chaves, Nº 820, Residencial Horto do Carvalho. I.
Araruama	Rua Maria Smol Santos, Nº 175, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua Valmir Soares Bezerra, Nº 54, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua João Das Mares, Nº 98, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua Maria Smol Santos, Nº 174, Residência Horto do Carvalho. II.
Araruama	Rua Valmir Soares Bezerra, Nº 54, Residência Horto do Carvalho. II.
Araruama	Rua Maria Smol Santos, Nº 162, Residência Horto do Carvalho. II.
Araruama	Rua "B", Nº 111, Residência Franco Freire I.
Araruama	Rua "D", Nº 88, Residência Franco Freire I.
Araruama	Rua "D", Nº 98, Residência Franco Freire I.
Araruama	Rua "E", Nº 154, Lotamento Aquarius I.
Araruama	Rua "B", Nº 11 na Casa A. Residência Franco Freire.
Araruama	Rua "B", Nº 11, Casa B. Residência Franco Freire.
Araruama	Rua "1", Nº 206, Residência Franco Freire.
Araruama	Rua "X", Nº 10, Residência Aquarius Bata.
Araruama	Rua "X", Nº 10, Residência Horto do Carvalho. II.
Araruama	Rua Valmir Soares Bezerra, Nº 54, Residência Horto do Carvalho.

Araruama	Rua da Viscondessa de Andrade, Nº 255, Residência Costa Nova II.
Araruama	Rua Nestor Souza Brás, Nº 37, Residência Costa Nova II.
Araruama	Ruas Ezequiel Gonçalves da Silva, Nº 37, Residência Via Verde II.
Araruama	Rua Nestor Souza Braz, Nº 37, Residência Costa Nova II.
Araruama	Rua T, Nº 337, Residência Franco Freire.
Araruama	Rua Maria Simão Santos, Nº 174, Residência Horto do Carvalho II.
Araruama	Rua João Henrique Menezes Fonseca, Nº 133, Residência Solar I.
Araruama	Rua T, Nº 227, Residência Franco Freire.
Araruama	Rua T, Nº 7, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua T, Nº 129, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Avenida Rubens Sabôa Ribeiro Chaves, Nº 530, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua L, Nº 100, Residência Horto do Carvalho.
Araruama	Rua T, Rua Maria Simão Santos, Nº 30, Residência Horto do Carvalho II.
Araruama	Expediente Lavoural Silva, Nº 221, Residência Costa Nova II.
Araruama	Avenida Rubens Sabôa Ribeiro Chaves, Nº 548, Residência Horto do Carvalho.
Atalaia	Arco de Orla.
Atalaia	Rua Monteiro Lobato.
Atalaia	Rua Firmino Fontes.
Atalaia	Avenida Oceânica.
Atalaia	Avenida Santos Dumont, Orla de Atalaia.
Buqui	Rua N3, Nº 01.
Cidade Nova	Rua T, Nº 29, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Avenida Visconde de Maracá, Nº 51.
Cidade Nova	Rua T, Nº 29, Alto da Jaqueira.
Cidade Nova	Avenida Visconde de Maracá, Nº 51.
Coroa do Meio	Rua Gerário de Souza, Nº 1571.
Coroa do Meio	Rua Doutor Volanteira Vieira de Melo.
Coroa do Meio	Avenida Santos Dumont, Nº 1750.
Dom Luciano	Rua T, com Rua W, Loteamento Volanteira.
Farefolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Farefolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Farefolândia	Mercado do Conjunto Augusto Franco.
Inácio Barbosa	Ruas Lourival Andrade, Nº 456, Conjunto Parque dos Coqueiros.
Inácio Barbosa	Avenida Universo, Conjunto Jardim Esperança.
Jatobá	Travessa X, Nº 30, Conjunto Santa Luzia.
Jatobá	Rua Palhaúno Pedro Leite da Silva, Nº 99.
Jatobá	Rua Palhaúno Pedro Leite da Silva, Nº 99.

Jablonina	Rua 9 ^o , Nº 57, Conjunto Santa Lucia
Jablonina	Rua 7 ^o , Nº 51, Loteamento Jardim dos Coqueiros, Conjunto Santa Lucia
Jablonina	Alça do Vadiado do DETRAN-SE
Jablonina	Rua Estudante Jailton Mello O. Silva, Nº 05
Jardins	Rua Rafael Monteiro Lobato.
Jardins	Rua Raimundo Oliveira Filho, Nº 70.
Lamarillo	Avenida Lamarillo, Nº 528.
Lamarillo	Avenida Lamarillo, Nº 528.
Mosqueiro	Rua Jamisson de Oliveira, Nº 60, Loteamento Santa Maria
Mosqueiro	Santários Publico da Cota Por do Sol.
Otaria	Rua "A", Nº 348, Loteamento Nova Liberdade II.
Oliven	Avenida Maria Fátima de Moraes, Nº 254.
Ponto Novo	Rua Nestor Stampato.
Ponto Novo	Rua Cipilão José Machado, Nº 07, Conjunto Cantinho Branco.
Ponto Novo	Praça Santiago Dantas, Nº 04, Conjunto Cantinho Branco.
Ponto Dantes	Rua 13 ^o , Nº 21, Ponto Senador Estanão Dantas.
Robalo	Travessa Curva do Rio, Nº 98.
Robalo	Freixo São Paulo, Nº 217.
Robalo	Rua 9 ^o , Nº 614, Loteamento Solares, Povoado São José.
Robalo	Rua Manoel Jovino Chagas, Nº 48.
Santa Maria	Rua 28 ^o , Nº 170.
Santa Maria	Rua B-4, Nº 04, Conjunto Valadores.
Santa Maria	Avenida Canal Santa Maria, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 256, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Rua São Vicente, Nº 258, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Avenida Canal Santa Maria, Nº 245, Loteamento Marivan.
Santa Maria	Avenida Geoduto, Nº 84, Invalado de Santa Maria.
Santa Maria	Rua B-5, Nº 90, Conjunto Valadores.
Santo Andréão	Rua Nossa Senhora da Glória, Nº 1134.
São Corrado	Rua B-7, Nº 54, Conjunto Orlando Dantas.
Siqueira Campos	Rua Acme, Nº 319.
Siqueira Campos	Rua Alguo, Nº 148.
Siqueira Campos	Rua Ilipians.
Siqueira Campos	Rua Fernando de Noronha, Nº 384.
Soldeide	Rua 1 ^o , Nº 605.
Sulblã	Rua Fernando de Aquino, esquina com Avenida Edivaldo Vieira de Melo.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125


OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.


SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de conjuntos sinalizadores e placas de parede

- Conjuntos sinalizadores e Placas de parede para as Ruas do Conjunto Residencial Jornalista Orlando Dantas (1ª Parte);
- Conjuntos sinalizadores na Praça Fausto Cardoso (Centro);
- Barramento de Pedestre (Gradiil) - foram instalados 68 (sessenta e oito) gradis em locais orientados pela fiscalização da SMTT;
- Conjuntos Sinalizadores e Placas de Parede para as Ruas do Bairro Atalaia - parte 03;
- Conjuntos sinalizadores e Placas de Parede no Alto do Santo Antônio (Santo Antônio).

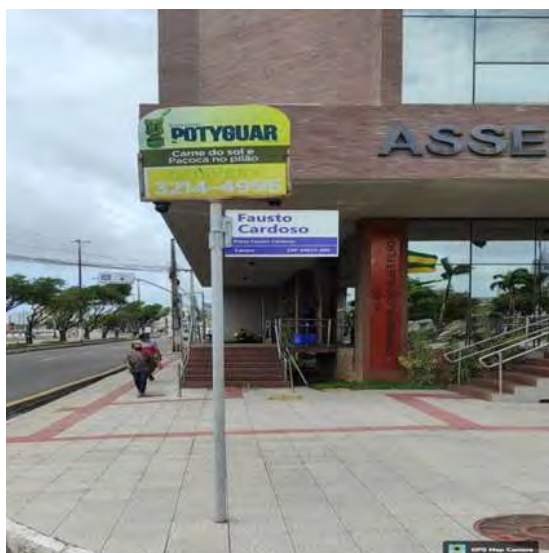

Av. Augusto Franco com
Av. Gonçalo Rollemberg Leite

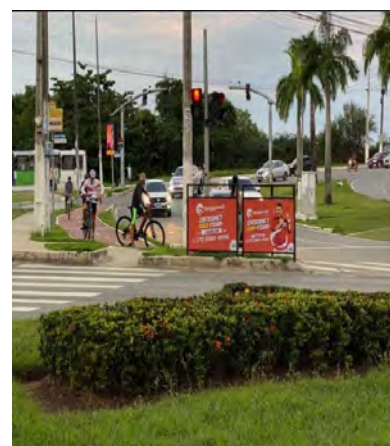

Av. Beira Mar



Av. Deputado Sívlio Teixeira
com Av. Adélia Franco



Canteiro central da Av. Ministro
Geraldo Barreto Sobral





DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.


- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

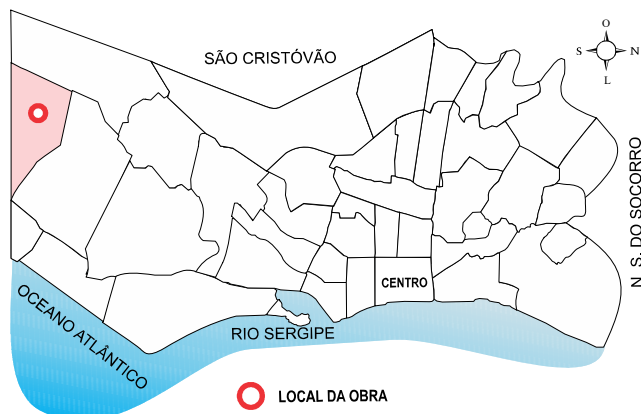

OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.


A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

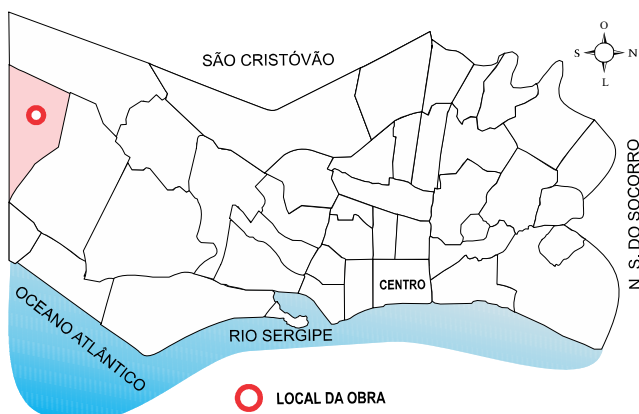


OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.

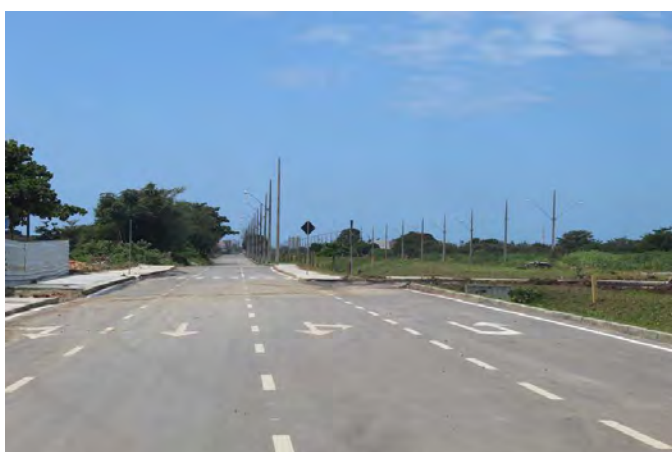

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração

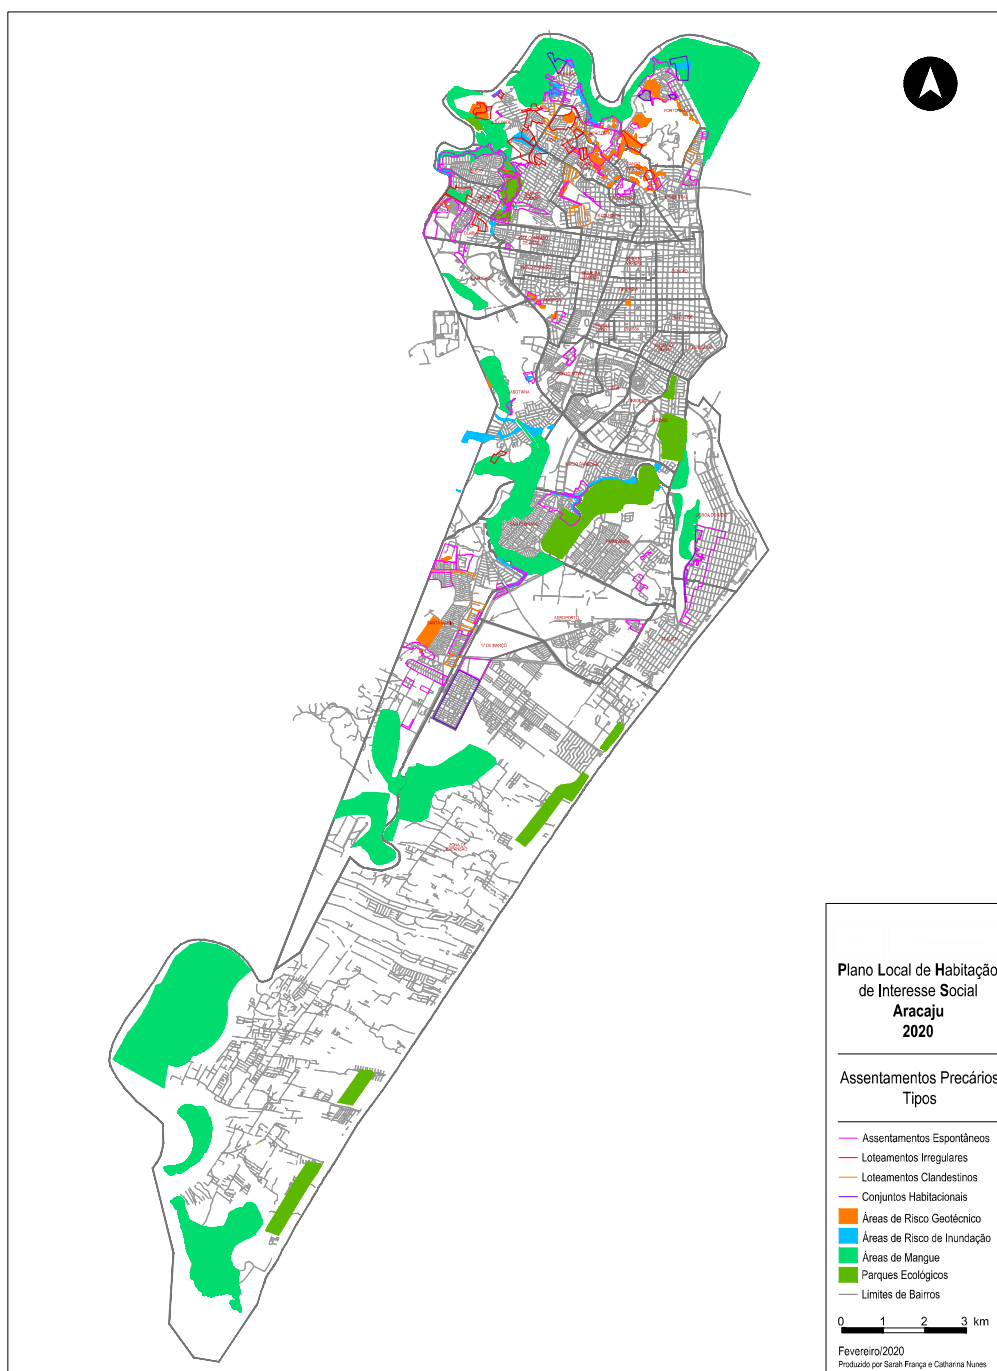

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

FASES DA PPP

- A PPP foi modelada em 4 fases:

Fase 0

Esta fase iniciou-se em 02/02/2021, a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). Ela já foi finalizada com as etapas cumpridas, conforme o contrato.

Após a eficácia do contrato, a concessionária iniciou sua mobilização para cumprimento das metas contratuais. Instalou-se em imóvel situado na avenida Augusto Franco, nº 2500, bairro Ponto Novo, onde implantou a sede do seu escritório central e o Centro de Controle Operacional (CCO).

Dentre as principais atividades executadas nesta fase destacam-se:

- Recadastramento do Parque de IP - Durante a modelagem da PPP, a previsão foi de 58.700 pontos de iluminação na cidade. Após um rigoroso recadastramento georreferenciado dos postes, braços, lâmpadas e vias do município, foram recadastrados 59.500 pontos do Parque de IP.
- Planos de Operação e Manutenção - Os Planos de Operação e Manutenção foram criados de acordo o que preconiza o contrato da PPP e aprovados pela gestão do contrato dentro dos prazos estipulados.

FASES DA PPP

Fase I

Com o término da Fase 0 e início da Fase I, no mês de junho, deu-se a assunção do Parque de IP pela concessionária. Ela começou a operar, fazendo a manutenção do Parque de IP, colocando em prática os planos de operação e manutenção.

Nesta fase foi elaborado o Plano de Modernização da iluminação pública e aprovado no início do mês de agosto. Esse plano inclui:

- Estudos luminotécnicos para a troca de luminárias por led. O estudo indicou qual tipo de lâmpada e potência são adequadas para cada local, de forma que se tenha uma iluminação uniforme na cidade.
- Plano para o sistema de telegestão, que será implantado em torno de 30% das vias da cidade;
- Plano de Iluminação Especial em 16 pontos turísticos e/ou monumentos, pré-determinados pela Prefeitura de Aracaju.

A concessionária implantou canais de comunicação para atender as demandas da população dos serviços da iluminação pública. Foi implantado um *call center* (0800 002 1743), disponível 24h, todos os dias da semana; o aplicativo Conecta Aracaju (disponível para download gratuito na PlayStore). Outros meios para informar eventuais problemas com a iluminação pública é o portal Conecta Aracaju Cidade Iluminada e o ponto fixo de atendimento, localizado na sede da Conecta.

FASES DA PPP

Fase II

Esta é a fase inicial da modernização do Parque de IP, que começou no mês de agosto e deverá ser concluída no mês de fevereiro/2023 (18 meses).

Dentre as principais atividades, destacam-se:

- Substituição das luminárias existentes por Luminárias de LED. No dia 10 de agosto, foi iniciada a substituição das lâmpadas existentes pelas de LED na avenida Poço do Mero, no bairro Bugio.
- Implantação da Iluminação Especial;
- Implantação do Sistema de Telegestão.

A concessionária pretende antecipar o prazo da modernização do Parque de IP em 6 meses, passando este prazo de 18 para 12 meses.

Além dos serviços acima descritos, nesta fase também iniciam os serviços de extensão de rede (implantação de postes, rede de energia e luminárias para atendimento ao sistema de iluminação pública do município) e a continuidade dos serviços de operação e manutenção do Parque de IP.

FASES DA PPP

Fase III

Esta fase terá início no mês de fevereiro/2023 e será concluída em fevereiro/2034 (11 anos).

Esta é a fase do término da modernização, prevista para acontecer no início do mês de fevereiro de 2023.

Nesta fase o Parque de IP do município de Aracaju estará modernizado e a concessionária continuará a prestação dos serviços de operação e manutenção do Parque e a implantação das extensões de rede.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), é a responsável por gerir o contrato da iluminação pública de Aracaju.

Todo o trabalho desenvolvido pela Conecta Aracaju é fiscalizado pela equipe técnica da Emurb, que fiscaliza o contrato, além da empresa Accenture, verificador independente contratado para monitorar e controlar o desempenho do projeto. Ela já está atuando desde a etapa do cadastramento dos pontos de iluminação e vai acompanhar toda a modernização do parque de iluminação da cidade.

FASES DA PPP

■ CRONOGRAMA DAS FASES

Nº	FASE			SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
	INICIO	FIM	PRAZO (+/-)	
0	02/02/2021	06/2021	120 dias	*Setup do PPP *Planos de Manutenção e Operação *Cadastro do Parque de IP
I	06/2021	08/2021	60 dias	*Assunção do Parque de IP para Manutenção, Operação *Plano de Modernização (incluindo os projetos)
II	08/2021	02/2023	18 meses	*Modernização do Parque de IP *Implantação dos locais de Iluminação Especial *Implantação da Telegestão *Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP
III	02/2023	02/02/2034	11 anos	*Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP



PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Realizados 2.560 atendimentos no mês de agosto.

STATUS DO CONTRATO DA PPP

MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IP – JUNHO A AGOSTO/2021

ATENDIMENTOS

1. REALIZADOS: 5.734 substituições de lâmpadas queimadas.

2. POR ORIGEM DE OCORRÊNCIA:

APP: 805

CALL CENTER: 2.630

INTERNET: 32

RONDA PRÓPRIA: 2.267





STATUS DO CONTRATO DA PPP

■ MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE IP – AGOSTO/2021

BAIRRO BUGIO

LOGRADOURO	QUANT
AV. CENTENARIO	49
AV. JOSE OLIVEIRA GUEDES	12
RUA GENY DA SILVA DIAS (CANTEIRO)	4
AV. POÇO DO MERO	94
RUA K	5
RUA J	6
RUA I	5
RUA H	4
RUA G	3
RUA ERIVALDO DA SILVA	3
RUA E	4
RUA D	5
RUA JORNALISTA ANTONIO CARLOS	31
RUA GENY DA SILVA DIAS	23
RUA JOSE ARNALDO COSTA	8
RUA CARIVALDO LIMA	10
PRAÇA DOM MARIO VILLAS BOAS	4
PRAÇA SANTIAGO DANTAS	4
TOTAL	274

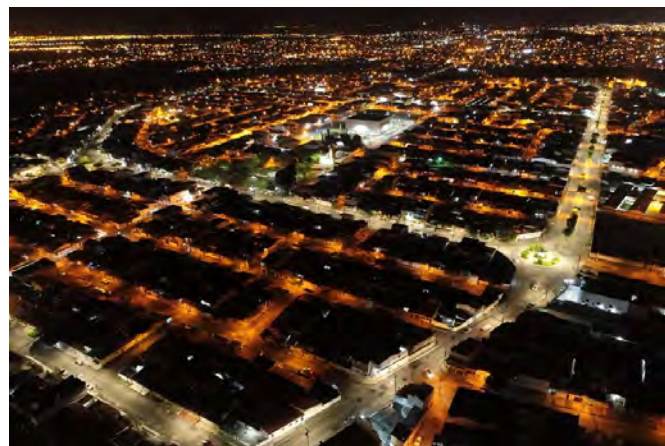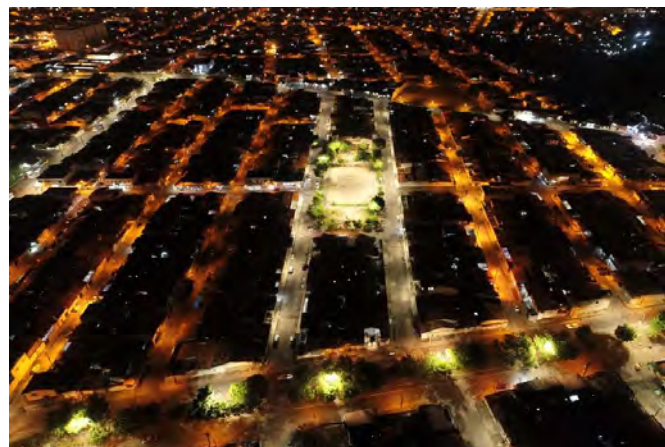

O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom
