

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Setembro / 2021



Infraestrutura do Loteamento Jardim Indara - Dom Luciano

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 4ª etapa - Bairro Dom Luciano	5
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	6
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	7
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	8
Infraestrutura dos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - Bairro Soledade	9
Infraestrutura do Loteamento Jardim Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas - Bairro Dom Luciano	10
Infraestrutura do Loteamento Rosa do Sol - Bairros Soledade e Santos Dumont	11
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio	12
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	13
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	14
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	15
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia	16
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo	17
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria	18
Implementação do novo terminal do mercado - Centro	19
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa	20
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho	21
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa	22
Reurbanização da área contígua à Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont	23
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria	24
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Bairro Mosqueiro	25
Construção da Praça '01' - Bairro 17 de Março	26
Construção da Praça '05' - Bairro 17 de Março	27
Construção da Praça '07' - Bairro 17 de Março	28
Construção da Praça '10' - Bairro 17 de Março	29
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	30
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens - Diversos bairros	31
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus/totens Av. Hermes Fontes/Adélia Franco	32
Revitalização do cercamento do Parque da Sementeira - Jardins	33
Infraestrutura para a Orlinha da Coroa do Meio - 2ª etapa - Coroa do Meio	34
Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim - Farolândia	35
Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida - Santos Dumont	36
Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva - Bairro 18 do Forte	37
Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo - Bairro Ponto Novo	38
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020	39
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021	40
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	41
Resumo de recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	42
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	43
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	44
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem)	45
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	46
Manutenção (drenagem)	47
Manutenção (serviços diversos)	48
Tabelas de quantitativos	49
3. DIRETORIA DE URBANISMO	53
Implantação de licenciamento digital	54
Quantitativo de saída de processos	55
Instalação de mobiliário urbano	56
Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)	57
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	58
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	59
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março	60
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa	61
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março	62
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	63
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública	65

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.937.618,96

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.



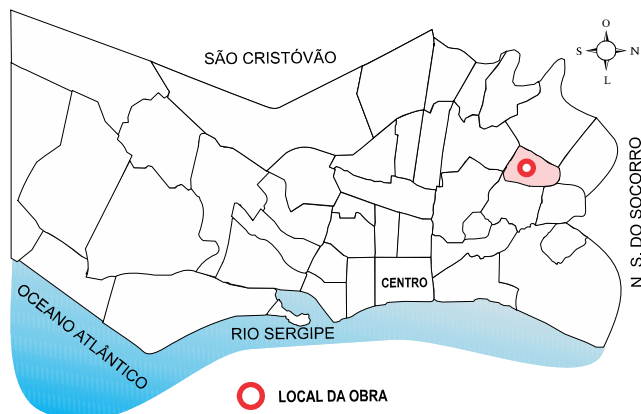

OBRA: Infraestrutura das Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, no Loteamento Moema Mary

LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 1.129.770,34

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando as Ruas Z, W e parte da Rua São Francisco, saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.


A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².



17 de Março

Complementação da construção de maternidade

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

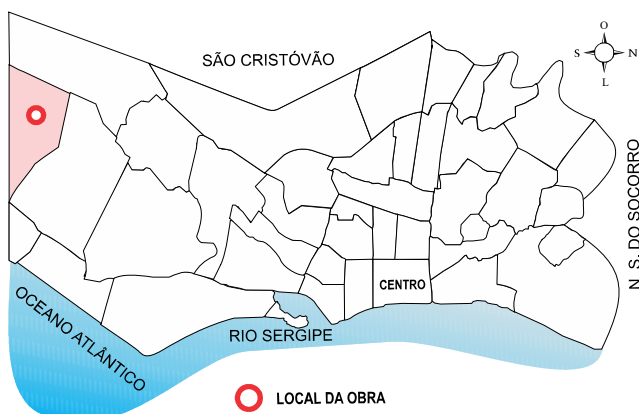

OBRA: Complementação da construção de maternidade


LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 18.079.814,02

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².



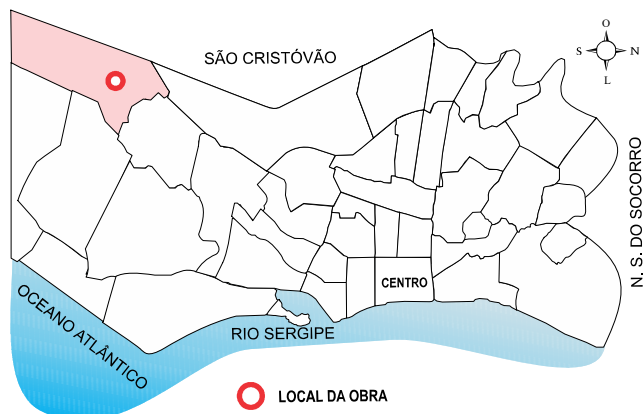

OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.



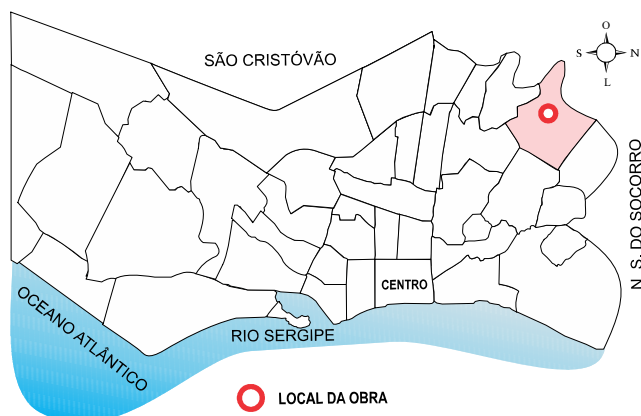


OBRA: Infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá - 1ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Soledade

CUSTO: R\$ 5.782.462,46

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

Implantação de infraestrutura nos Loteamentos Isabel Martins, Santa Catarina e Guarujá, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de 20 ruas, drenagem pluvial, rede de esgoto, sinalização e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: Ruas C, D, E, E-2, F, G, H, I, L, N, O, P, M, Rua do Toque, Rua dos Cravos, Travessas G, P, M, N e Avenida J.

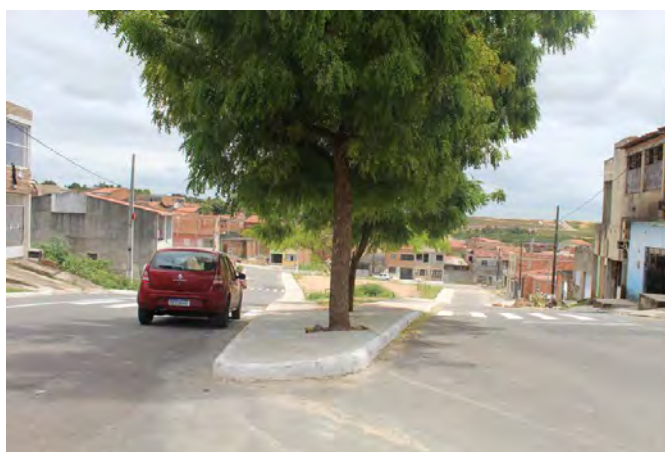



OBRA: Infraestrutura do Loteamento Indara e esgotamento sanitário da Rua Alagoinhas e entorno.


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 4.769.500,94

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, implantação de rede pluvial e de rede de esgotamento sanitário e pavimentação. A obra também contempla a implantação de rede de esgotamento sanitário na rua Alagoinhas e entorno.



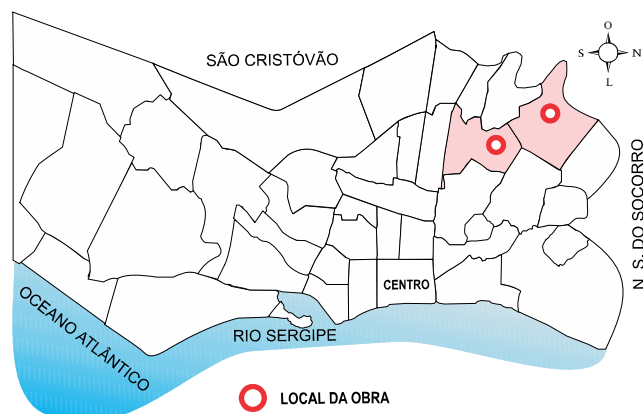

OBRA: Infraestrutura e urbanização do Loteamento Rosa do Sol, no bairro Soledade e Rua 'C', no bairro Santos Dumont

LOCALIZAÇÃO: Bairros Soledade e Santos Dumont

CUSTO: R\$ 8.583.445,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construção Ltda.

Obra de infraestrutura com a execução dos seguintes serviços: terraplenagem; implantação de rede de drenagem com galerias em concreto armado; implantação de rede de esgotamento sanitário; 21 mil m² de pavimentação em paralelepípedo; meio-fio e acessibilidade. Serão contempladas as seguintes vias: - Loteamento Rosa do Sol: Avenida "A"; Ruas: "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"; "G"; "H"; "I"; "J"; "K"; Travessas: "A"; "B"; "C"; "D"; "L" - Bairro Soledade; e Rua "C" - Bairro Santos Dumont.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.



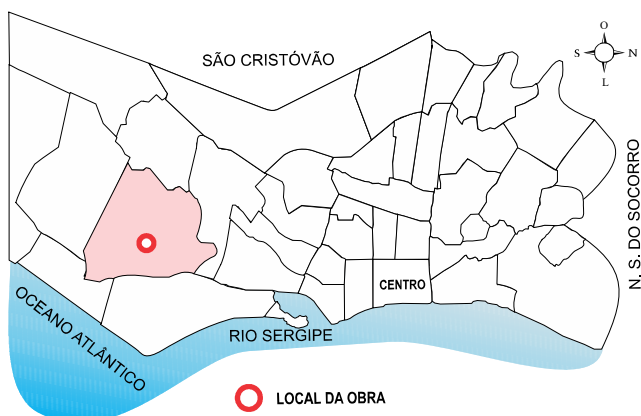


OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².

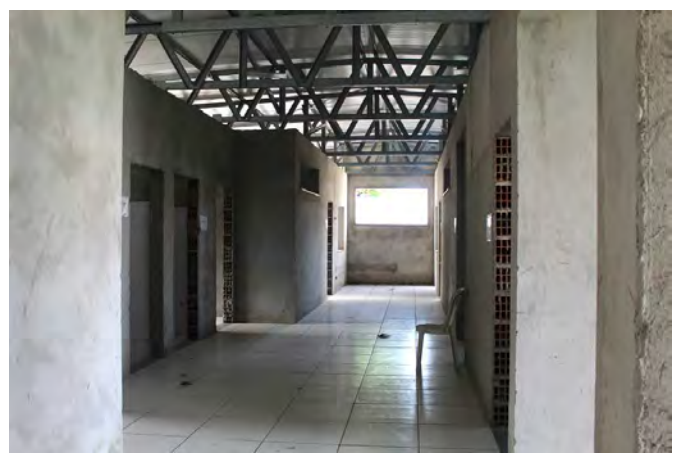



OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade


CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI DR. JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE
Bairro Japãozinho

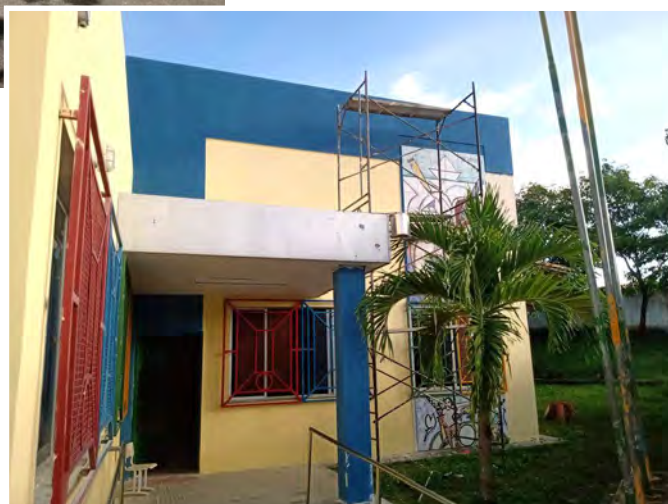




OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.

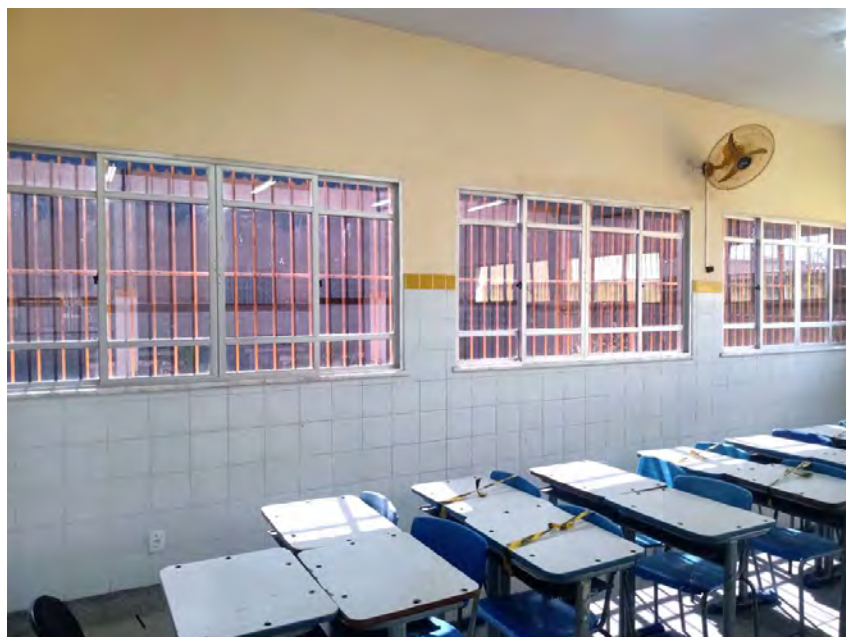

EMEF DEPUTADO JAIME ARAÚJO
Bairro Soledade

EMEI IRENE ROMÃO DE BRITO
Bairro Santa Maria






OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 939.364,23

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.

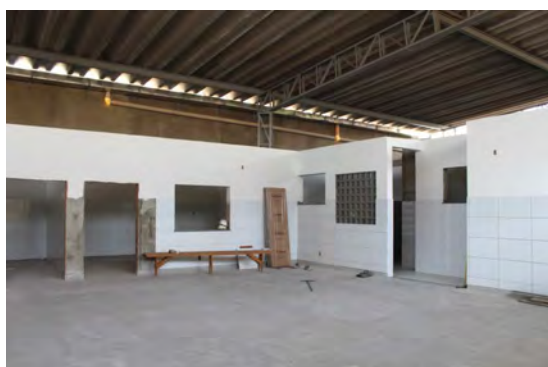



OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 704.148,37

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.



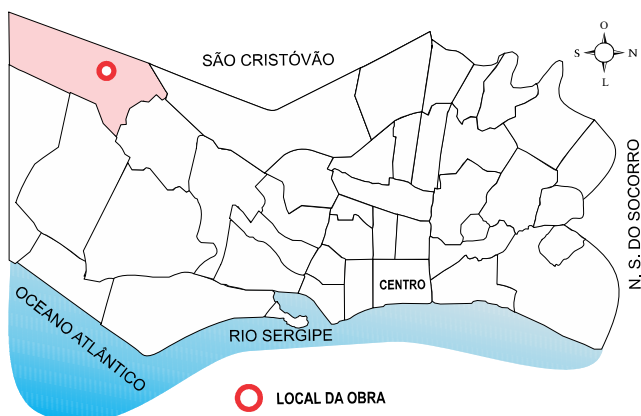

OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.






OBRA: Implementação do novo terminal do mercado


LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 11.158.882,90

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.

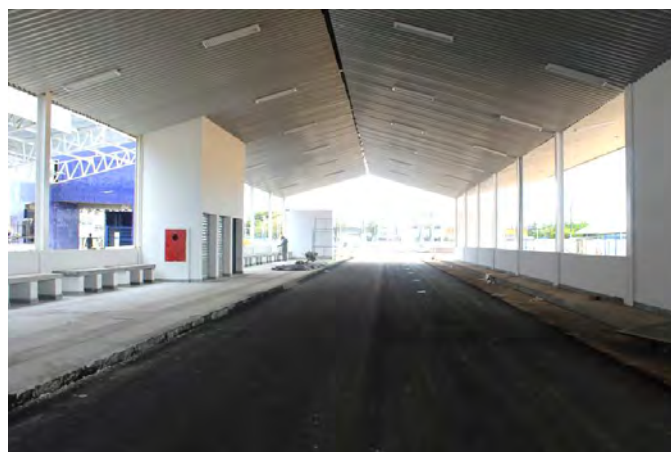

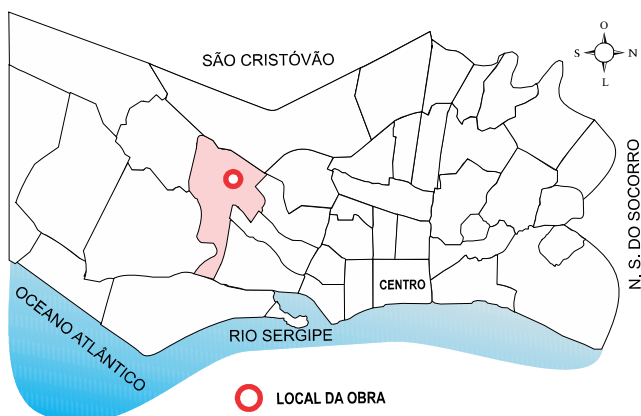

OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT


LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.542.877,81

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.



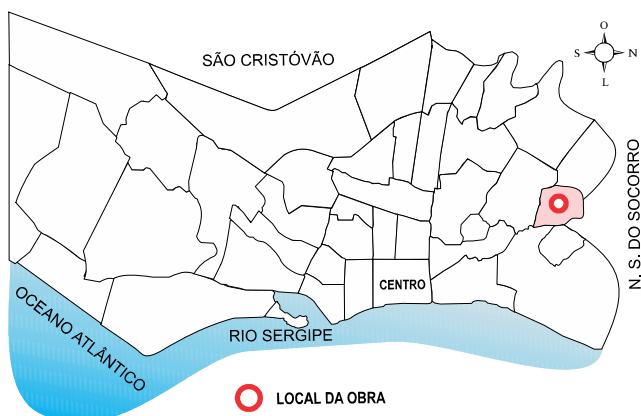

OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Intefração do Distrito Industrial de Aracaju.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.



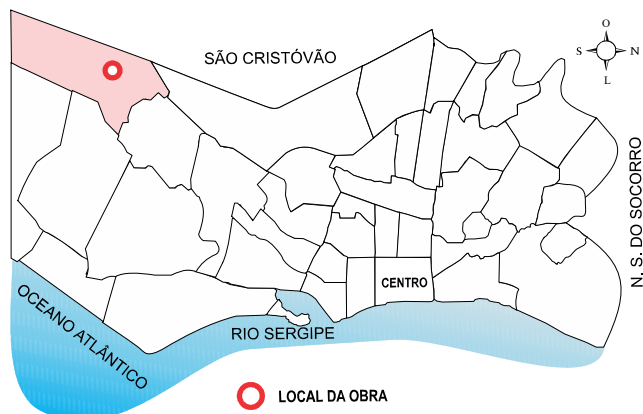

OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.



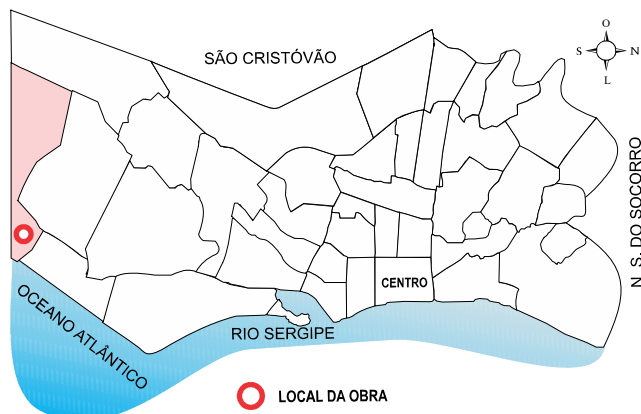

OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Mosqueiro

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções

A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



**OBRA:** Construção da Praça '01'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 925.720,38**EMPRESA:** Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '05'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

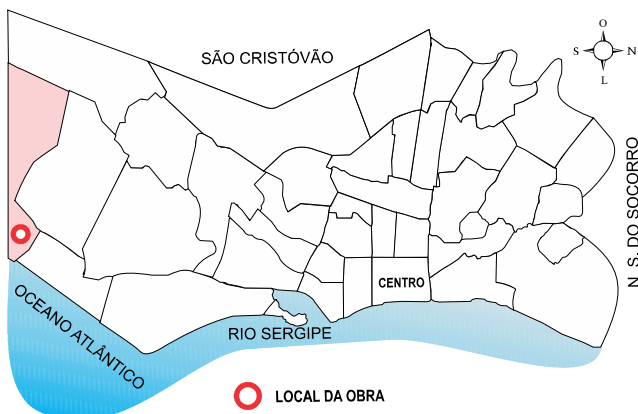

OBRA: Construção da Praça '05'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março


CUSTO: R\$ 568.893,96

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.

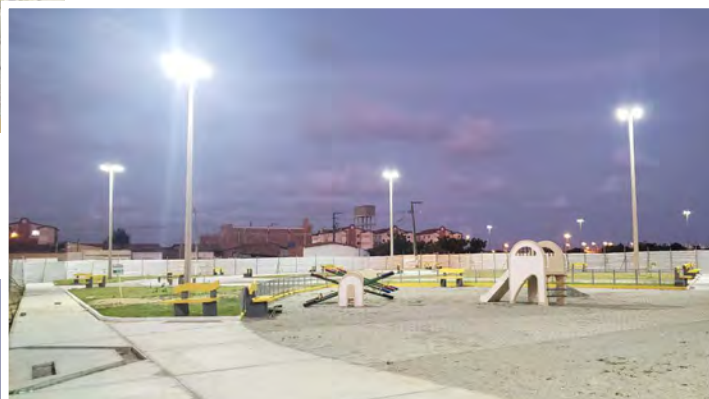

17 de Março

Construção da Praça '07'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

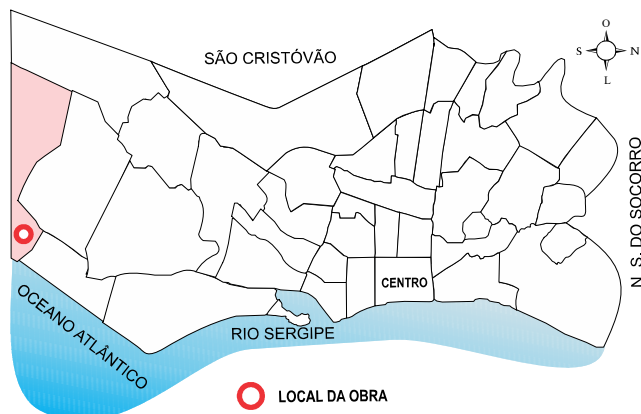

OBRA: Construção da Praça '07'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 872.101,14

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '10'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

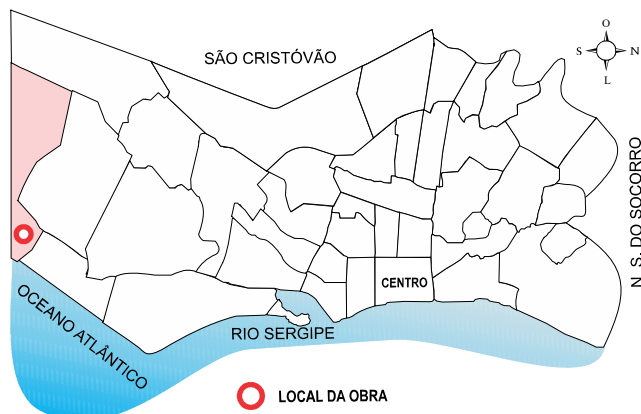

OBRA: Construção da Praça '10'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 500.998,43

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão



EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO
Bairro São Conrado



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Siqueira Campos

Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade


CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens

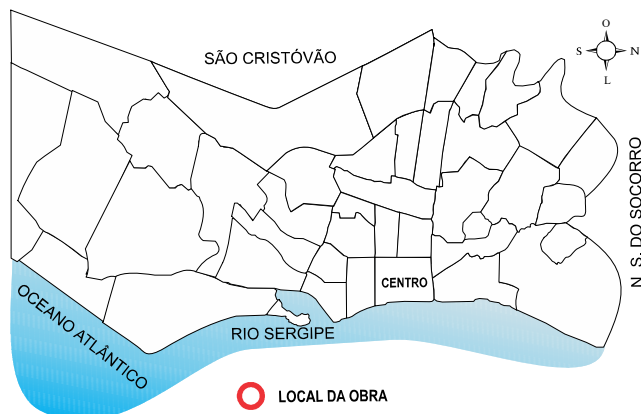

OBRA: Fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade


CUSTO: R\$ 759.553,57

EMPRESA: Construtora Sol

O contrato consiste no fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco



Revitalização do cercamento do Parque da Sementeira

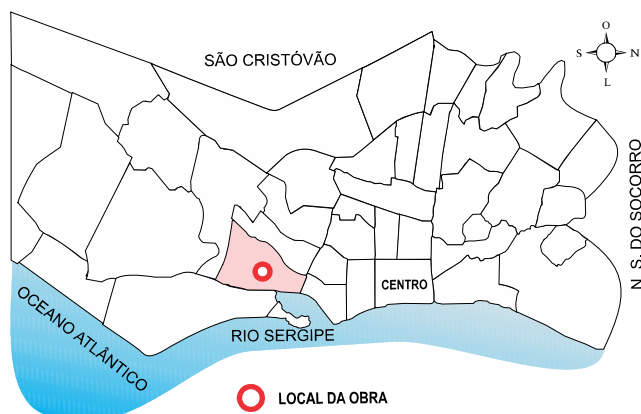

OBRA: Revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins

CUSTO: R\$ 2.540.689,11


EMPRESA: Sercol Engenharia

Obra com recursos do



A revitalização do cercamento e entradas do Parque da Sementeira vai garantir a segurança patrimonial do local e o bem-estar dos frequentadores e pedestres. Será criada uma nova imagem do parque para os cidadãos, reforçando suas características já consolidadas. O projeto reforça a integração do parque com o entorno urbano e marca sua singularidade na paisagem. No novo cercamento será efetuado um recuo em relação ao gradeado atual, visando maior integração dos pedestres, na área externa, com o parque como um todo. Algumas árvores existentes passam a ficar na área externa do parque, contribuindo para a diminuição da sensação de divisão de espaços. Os acessos receberão elementos em concreto de tamanhos variáveis, que estarão dispostos de forma intercalada em um padrão de cores específico para cada entrada, com variação das tonalidades, de acordo com o setor indicado. Já os estacionamentos existentes no entorno do parque passarão por manutenção e revitalização, recebendo também nova sinalização e pintura indicativa. O estacionamento disponível à CCTECA será ampliado.



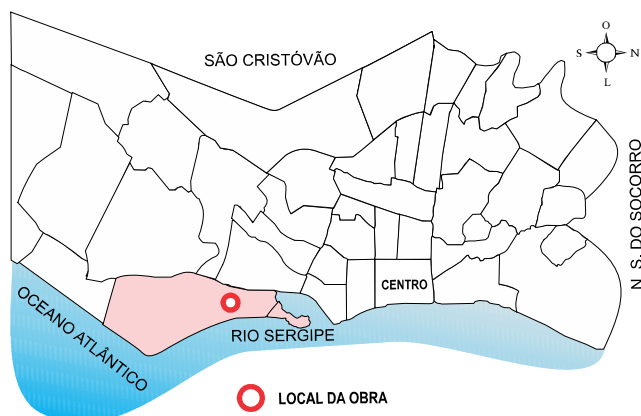

OBRA: Infraestrutura para a Orlinha do Bairro Coroa do Meio - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 4.133.837,94

EMPRESA: Torre Empreendimentos

Nessa 2ª etapa de implantação de infraestrutura na Orlinha da Coroa do Meio, a Prefeitura de Aracaju vai executar uma nova configuração urbanística na região. Serão implantados cerca de 9.700 m² de passeios em concreto, 2.020 m² de ciclovia, pavimentação asfáltica em pouco mais de 21.000 m² e parte do pavimento receberá 1.800 m² de piso intertravado. A nova área urbanizada receberá uma moderna iluminação, rampas de acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. Além disso, será implantada uma rede de drenagem de 720,0 metros e instalações hidrossanitárias.



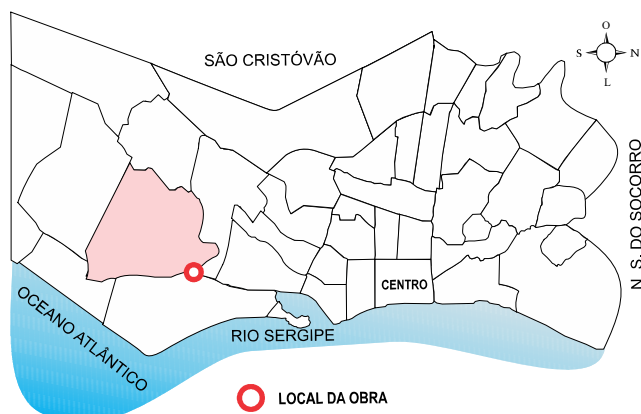

OBRA: Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar

LOCALIZAÇÃO: Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 17.536.642,29

EMPRESA: Procec Engenharia S/A

Inaugurada em 1958, a Ponte Juscelino Kubitschek foi um marco na mobilidade urbana da cidade. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da avenida Beira Mar. A ponte possui 160 m de extensão e as intervenções nos dois lados da ponte serão distintas. Em ambos, será construída uma nova pista de rolamento, com 4,0 m de largura cada. No sentido Centro-Praia, será implantada uma pista para pedestres, uma vez que, no sentido Praia-Centro, já existe pista para pedestre e ciclovia. Nessa obra, serão utilizadas 438 toneladas de aço e mais de 3.000 m³ de concreto. Além disso, serão colocadas 50 estacas de 0,80 m de diâmetro e 45,0 m de profundidade. Quando concluída, a nova ponte terá três faixas de pista de rolamento em cada sentido, com 12,0 m de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres e vai beneficiar a acessibilidade do local, oferecendo mais segurança e conforto aos usuários.





OBRA: Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 631.471,17

EMPRESA: Construtora Camel Ltda.

A obra consiste na construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida.



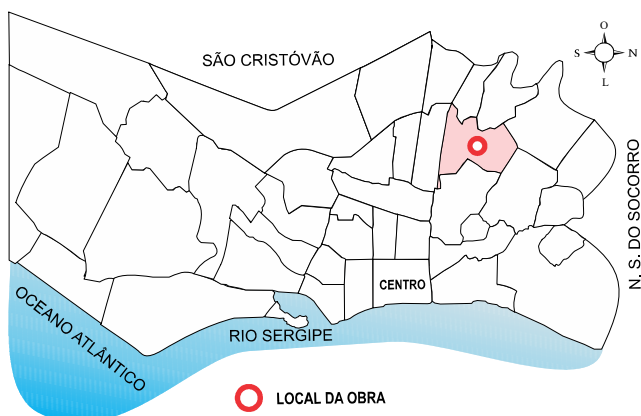

OBRA: Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 2.752.161,06

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

A obra consiste na reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva.





OBRA: Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos


LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 315.606,35

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.



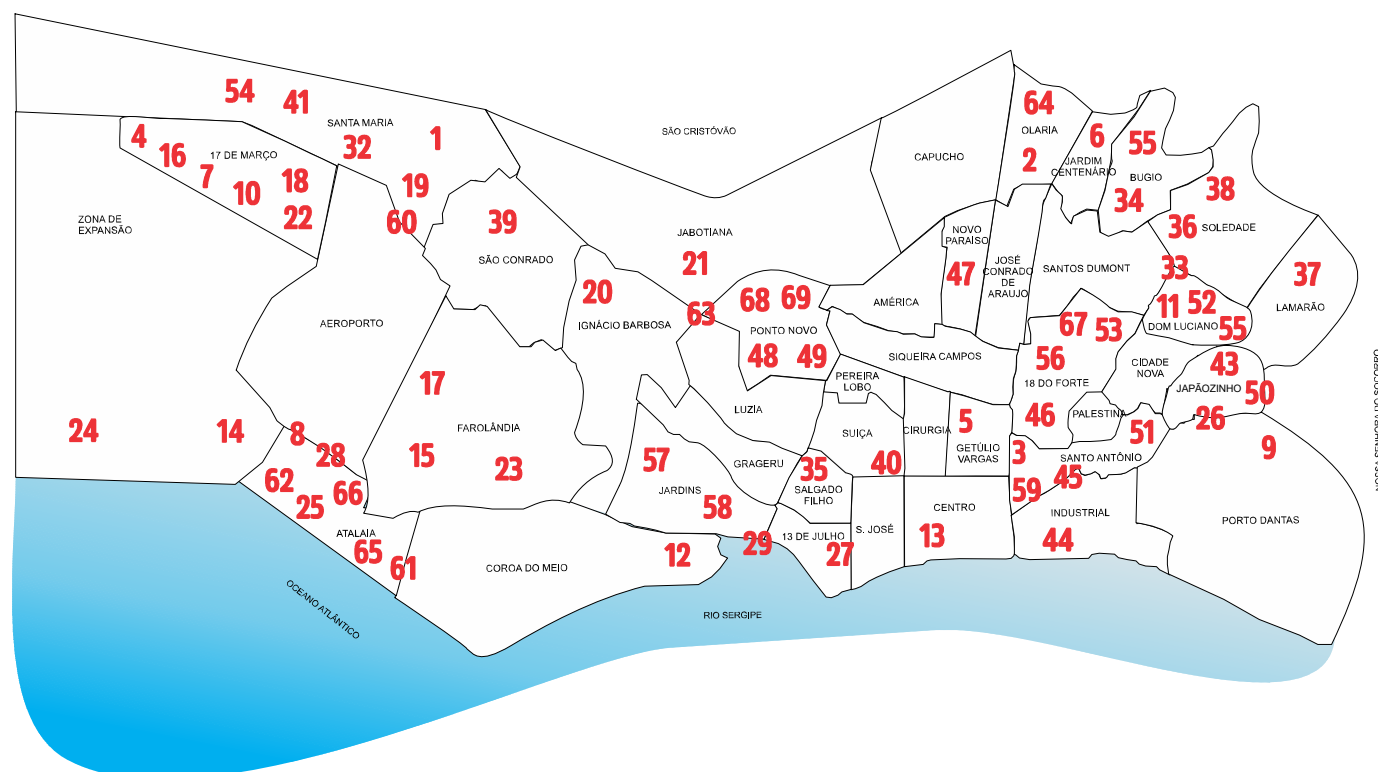

- | | |
|---|--|
| 1. Construção da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumbiy Filho (Santa Maria) | 35. Demolição e reconstrução do pontilhão localizado na Avenida Anísio Azevedo com Rua Lagarto (Salgado Filho) |
| 2. Construção do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Abrahão Crispim de Souza (Olaria) | 36. Implantação de quadra de futebol society (Soledade) |
| 3. Infraestrutura do Loteamento Jardim Petrópolis (Santo Antônio) | 37. Recuperação do muro de contenção e fechamento da EMEI Monsenhor João Moreira Lima (Lamarão) |
| 4. Complementação da Interligação das Avenidas 04 e Alexandre Alcino (17 de Março) | 38. Infraestrutura dos Loteamentos Jardim Bahia I e II (Soledade) |
| 5. Requalificação da Praça dos Expedicionários e entorno (Getúlio Vargas) | 39. Reconstrução da quadra poliesportiva da EMEF Arthur Bispo do Rosário (São Conrado) |
| 6. Construção de Estação Elevatória de Esgoto - Lot. Nova Liberdade II (Jardim Centenário) | 40. Infraestrutura do corredor de transporte Hermes Fontes (Diversos bairros) |
| 7. Complementação da Construção da Escola Municipal de Educação Fundamental "José Souza de Jesus" (17 de Março) | 41. Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (Santa Maria) |
| 8. Serviços complementares da construção do Canal Costa do Sol (Atalaia e Aeroporto) | 42. Manutenção das unidades da Secretaria Municipal da Assistência Social (Diversos bairros) |
| 9. Complementação da infraestrutura do Coqueiral (Coqueiral) | 43. Reforma do campo de futebol, localizado na Praça entre as ruas "L" e "M" (Japãozinho) |
| 10. Complementação da infraestrutura do Bloco 2 (17 de Março) | 44. Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial - 1ª etapa (Industrial) |
| 11. Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 1ª Etapa (Bairro Dom Luciano) | 45. Infraestrutura das principais vias do município - 1ª etapa (Diversos bairros) |
| 12. Reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio - 1ª Etapa (Coroa do Meio) | 46. Infraestrutura da Avenida 12 de Outubro e Rua 'A' - Lot. Expansão Siqueira Campos (18 do Forte) |
| 13. Revitalização do prédio da FUNDAT (Centro) | 47. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Carvalho Neto (Novo Paraíso) |
| 14. Infraestrutura do Loteamento Aruana (Aruana) | 48. Reforma e aplicação da sede da Emurb (Ponto Novo) |
| 15. Infraestrutura das Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos - Cj. Augusto Franco (Farolândia) | 49. Infraestrutura das principais vias do município - 2ª etapa (Diversos bairros) |
| 16. Construção da UBS Dr. Roberto Paixão (17 de Março) | 50. Complementação da infraestrutura de ruas do Japãozinho (Japãozinho) |
| 17. Complementação da infraestrutura do Barroso (Farolândia) | 51. Construção da EMEF Dom José Vicente Távora (Santa Antônio) |
| 18. Complementação da infraestrutura da área externa dos 16 blocos de apartamentos (17 de Março) | 52. Infraestrutura do Loteamento Tia Caçula e Rua Alagoinhas (Dom Luciano) |
| 19. Complementação da infraestrutura dos Conjuntos Padre Pedro (2ª etapa) e Antonio Carlos Valadares (Santa Maria) | 53. Infraestrutura do Loteamento Expansão Siqueira Campos (18 do Forte) |
| 20. Complementação da infraestrutura da Comunidade Pantanal (Inácio Barbosa) | 54. Infraestrutura do Loteamento Paraíso do Sul (Santa Maria) |
| 21. Complementação da reforma e ampliação da EMEF José Aírton de Andrade (Jabotiana) | 55. Reforma do campo de futebol do Anchieta (Bugio) |
| 22. Complementação da construção de 16 blocos de apartamentos (17 de Março) | 56. Reurbanização da Praça Mário Valois Galvão (18 do Forte) |
| 23. Complementação da infraestrutura de ruas da Farolândia (Farolândia) | 57. Infraestrutura do Loteamento Jardim Nice (Jardins) |
| 24. Reparos na quadra da EMEF Prof. Florentino Nenezes - Pov. Mosqueiro (Zona de Expansão) | 58. Urbanização de área no Loteamento Tramandai (Jardins) |
| 25. Complementação da pavimentação e drenagem no Bairro Atalaia - 1ª Etapa (Atalaia) | 59. Reurbanização da Praça Princesa Isabel (Santo Antônio) |
| 26. Recuperação do pavimento da Av. Gal. Euclides Figueiredo, no trecho entre a Rua "C" (Coqueiral) e Rua "A" (Japãozinho) (Coqueiral e Japãozinho) | 60. Complementação da infraestrutura do Marivan (Marivan) |
| 27. Reconstrução do pontilhão entre Av. Anísio Azevedo e Rua Guilherme Rezende (13 de Julho) | 61. Complementação da Infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio (Atalaia / Coroa do Meio) |
| 28. Complementação da construção do Canal Beira Mar (Atalaia e Aeroporto) | 62. Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental Anísio Teixeira (Atalaia) |
| 29. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Beira Mar (Diversos bairros) | 63. Infraestrutura do corredor de transporte da Av. Augusto Franco (Diversos bairros) |
| 30. Manutenção da EMEF Marechal Henrique Teixeira Lott (América) | 64. Infraestrutura para o canal do Loteamento São Carlos (Olaria) |
| 31. Infraestrutura do corredor de transporte Centro-Augusto Franco (Diversos bairros) | 65. Reforma do Terminal de Integração da Atalaia (Atalaia) |
| 32. Infraestrutura da Comunidade Santa Maria, Residencial São Lucas e Loteamento Senhor do Bomfim (Santa Maria) | 66. Construção de boxes, casa de gás e adequação da acessibilidade com lombosbaixa do Terminal de Integração (Atalaia) |
| 33. Infraestrutura da Av. Gal. Euclides Figueiredo (Soledade e Dom Luciano) | 67. Urbanização de praça entre as ruas Bela Vista e Luiz Gonzaga (18 do Forte) |
| 34. Construção da Estação Cidadania - Esporte (Bairro Bugio) | 68. Reurbanização da Praça Santiago Dantas (Ponto Novo) |
| | 69. Reurbanização da Praça Professor Mário Vilas Boas (Ponto Novo) |

Projetos contratados

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Japãozinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES




Recapeamento / Pavimentação

2017 - 2021


102,89 km


de vias recapeadas / pavimentadas

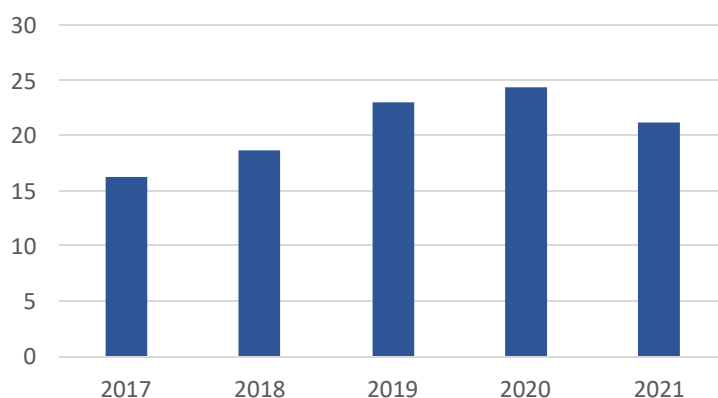


79.820 t

de asfalto aplicado

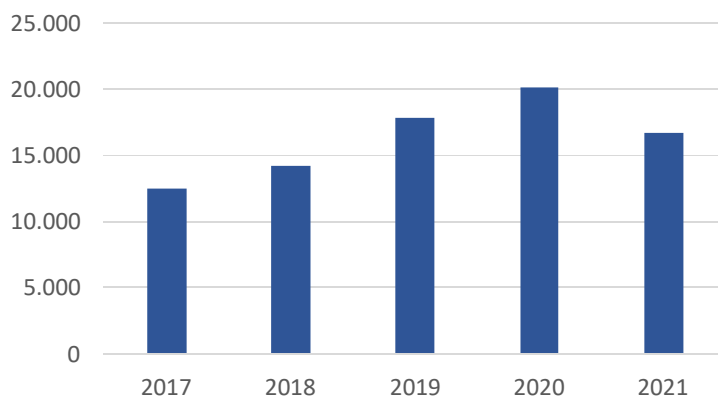

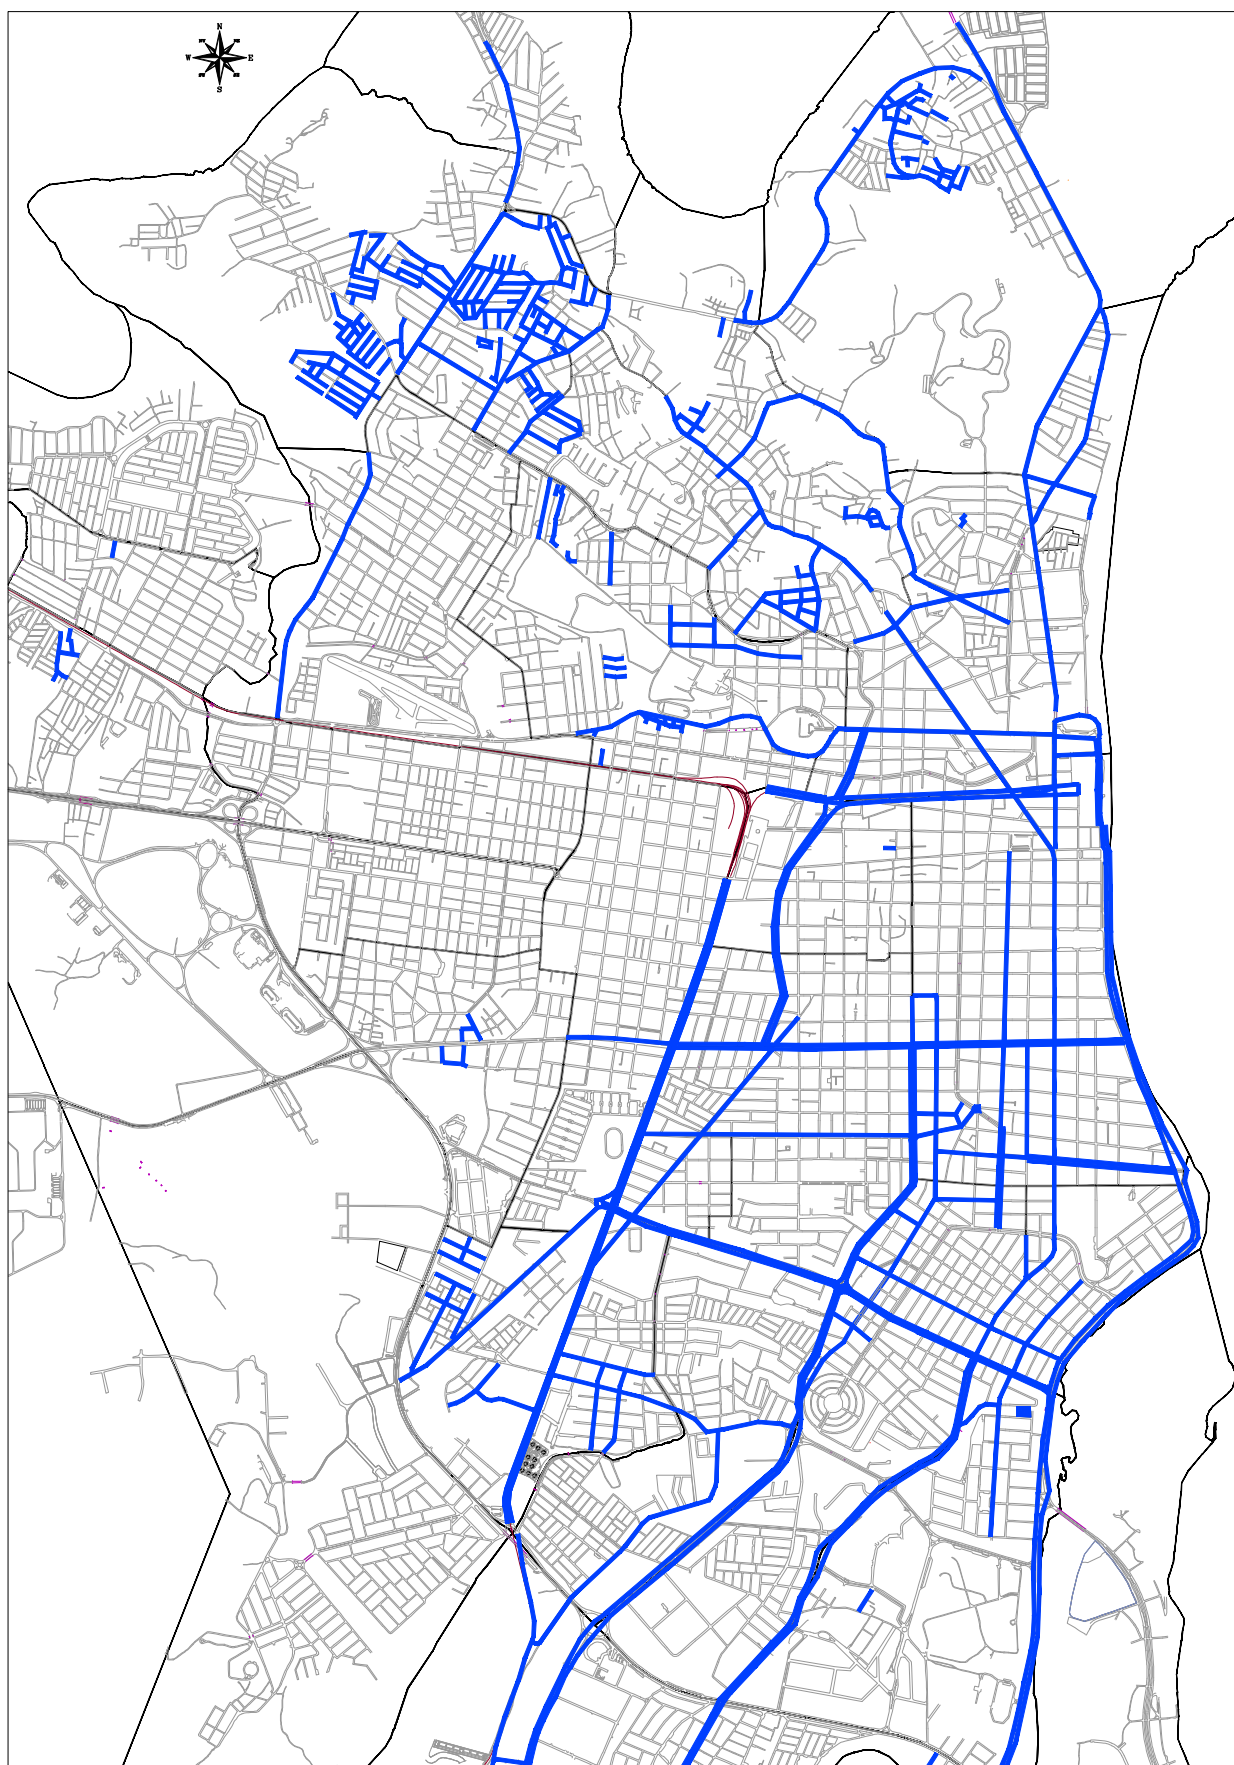

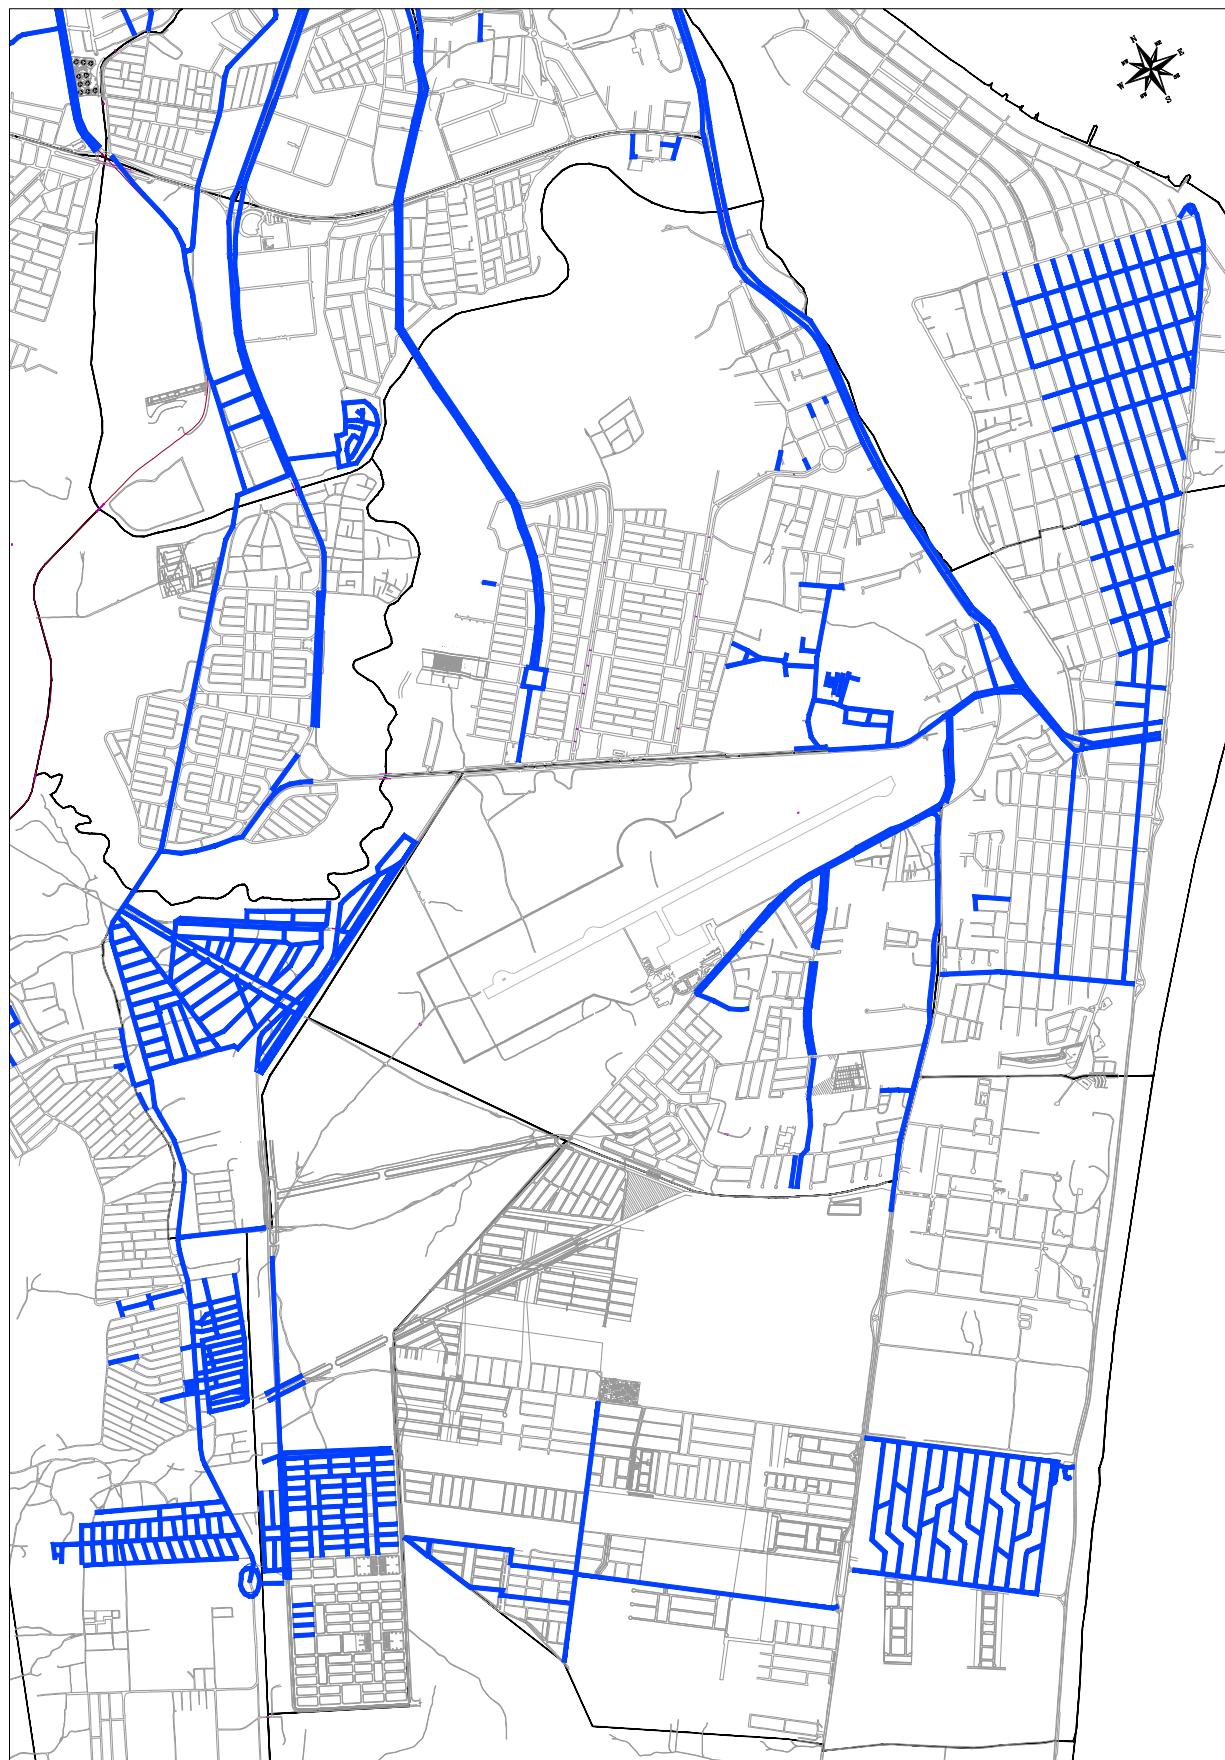

Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo - São José / Cirurgia / Suíssa



Av. Gonalo Prado Rollemberg



Largo do Carro Quebrado - So Jos



Rua 'H' - Lot. Moema Mary



Av. Santos Dumont - Coroa do Meio



TAPA-BURACOS



Av. Euclides Figueiredo
Porto D'Antas



Av. Tancredo Campos
Industrial



Rua Vereador João Calazans
13 de Julho



Av. Frei Augusto
de Santana
Dom Luciano



Av. João Amazonas - 17 de Março



Av. Maranhão - José Conrado de Araújo



Rua Curva do Rio - Robalo

Av. Beira Mar - 13 de Julho



Av. Gasoduto - São Conrado



Rua 'A' - Lot. Atalaia Sul



Rua Antônio José dos Santos - Jabotiana



Rua Constantino Gomes de Souza - Cj. Costa e Silva



Rua Eriberto Resende Goes - Atalaia



Rua José de Melo - Santos Dumont



Rua Mário de Andrade - Farolândia



Implantação de defesa no Canal Comandante Miranda - Santos Dumont



Reurbanização da rótula da Av. Nestor Sampaio - Luzia



Recuperação do Estádio João Hora - Siqueira Campos



MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, Nº 168
13 DE JULHO	PRAÇA DA IMPRENSA
13 DE JULHO	RUA VER. JOÃO CALAZANS, ENTRE AVENIDA ANIZO AZEVEDO E RUA JULIO SANTANA
13 DE JULHO	RUA ALVARO SILVA, ENTRE RUA DES. JOSE SOTERO E AVENIDA GOV. PAULO BARRETO DE MENEZES
13 DE JULHO	RUA DR. CELSO OLIVEIRA, ENTRE RUA VILA CRISTINA E AVENIDA BERA MMR
13 DE JULHO	RUA VER. JOÃO CALAZANS, ENTRE AV. GOV. PAULO B. DE MENEZES E RUA RAMUNDO FONSECA
13 DE JULHO	TRAVESSA JOÃO OLÍMPIO MANGUEIRA, ENTRE RUA RAMUNDO FONSECA E RUA VER. JOÃO CALAZANS
13 DE JULHO	RUA RAMUNDO FONSECA, ENTRE RUA JOAQUIM GOIS E AVENIDA GOV. PAULO BARRETO DE MENEZES
13 DE JULHO	RUA JOAQUIM GOIS, ENTRE RUA CAMPO DO BRITO E Nº 65
13 DE JULHO	RUA JOAQUIM GOIS, ENTRE Nº 65 E RUA RAMUNDO FONSECA
13 DE JULHO	RUA DES. JOSÉ SOTERO, ENTRE AVENIDA BERA MMR E RUA VILA CRISTINA
13 DE JULHO	RUA JULIO SANTANA, ENTRE AVENIDA BERA MMR E RUA DR. CELSO OLIVEIRA
17 DE MARÇO	PRAÇA DE COM RUA 43
17 DE MARÇO	PRAÇA 10 COM RUA 29
17 DE MARÇO	AVENIDA JOÃO AMAZONS, ENTRE RUA MANOEL NUNES RESENDE E Nº 17
18 DO FORTE	RUA TENENTE JANSEN MELO, DO Nº 215 ATÉ A RUA ALCIDES FERREIRA
18 DO FORTE	RUA OS DE JULHO COM RUA MONTE CASTELO, ATÉ A RUA ALCIDES FERREIRA
18 DO FORTE	RUA TENENTE DUTRA, DO Nº 229 ATÉ AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
18 DO FORTE	RUA JORN. GERALDO MENDES, ENTRE Nº 228 E Nº 242
AEROPORTO	AVENIDA FABIO JOSE CARDOSO RAMOS, ENTRE AVENIDA MELCHIOR MACHADO E RUA MANOEL MOTA
AEROPORTO	RUA FABIO JOSE CARDOSO RAMOS, ENTRE RUA MANOEL MOTA E RUA DOS LIROS
AEROPORTO	RUA JOSE OLIVEIRA BARROS, Nº 8 - C.J. SANTA TEREZA
AEROPORTO	RUA JOSE OLIVEIRA BARROS, Nº 05 - C.J. SANTA TEREZA
AMERICA	RUA AMAPA COM RUA ACRE
AMERICA	RUA ESTADOS UNIDOS COM RUA COLOMBIA
AMERICA	AVENIDA DR. JOSE DA SILVA RIBEIRO FILHO COM AVENIDA MAL. CÂNDIDO RONDON, ATÉ A RUA ACRE
AMERICA	RUA PEDRA BRANCA COM RUA ALZIRA
AMERICA	AVENIDA PROF. JOSE OLÍMPIO DE LIMA NETO, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA TANCREDO NEVES
AMERICA	AVENIDA BRASIL, Nº 291
AMERICA	RUA ESTADOS UNIDOS, ENTRE AVENIDA BRASIL E Nº 50
ATALAIA	AVENIDA MARIO JORGE MENEZES VIEIRA COM RUA YOLANDO VIEIRA DE MELO
ATALAIA	TRAVESSA DEPUTADO RAMUNDO DINIZ
ATALAIA	RUA DEP. RAMUNDO DINIZ, ENTRE AVENIDA MONTEIRO LOBATO E Nº 30
BUGIO	RUA GENY DA SILVA DIAS, ENTRE Nº 1545 E RUA JOÃO DE DEUS OLIVEIRA
BUGIO	RUA QUATRO, ENTRE RUA JOÃO DE DEUS OLIVEIRA E RUA SETE
BUGIO	RUA GENY DA SILVA DIAS, ENTRE AVENIDA CENTENÁRIO E Nº 158
BUGIO	RUA VER. PEDRO ALCANTARA CARVALHO, ENTRE Nº 346 E RUA F3
BUGIO	RUA E 3, ENTRE RUA VER. PEDRO ALCANTARA CARVALHO E RUA CLEOVANSOSTENES DOS SANTOS
BUGIO	RUA F 3, ENTRE RUA VER. PEDRO ALCANTARA CARVALHO E RUA NATALIA DE MELO ANDRADE
BUGIO	RUA CLEOVANSOSTENES DOS SANTOS COM RUA J. 2
BUGIO	RUA J. 2 - Nº 165
BUGIO	RUA TRÊS, ENTRE RUA F TRÊS E Nº 114
BUGIO	RUA F3, ENTRE Nº 276 E Nº 300
BUGIO	RUA FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA, Nº 268
BUGIO	RUA NATALIA DE MELO ANDRADE, ENTRE RUA F3 E Nº 90
CENTRO	RUA SANTO AMARO, ENTRE Nº 206 E Nº 40
CENTRO	TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE RUA JOÃO PESSOA E RUA ITABAINHANA
CENTRO	PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS
CENTRO	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES COM RUA MARLIM
CENTRO	RUA TAPORANGA, ENTRE Nº 103 E Nº 161
CENTRO	RUA SANTA LUZIA, Nº 27
CIDADE NOVA	RUA J, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - LOT. REZENDE
CIDADE NOVA	RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, ENTRE RUA J E RUA E - LOT. REZENDE
CIDADE NOVA	RUA L, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - LOT. REZENDE
CIDADE NOVA	RUA B COM AVENIDA M - LOT. GETIMANA
CIDADE NOVA	RUA SANTA TEREZA, ENTRE AVENIDA FREI AUGUSTO SANTANA E EMEL. JOÃO TELES MENEZES
CORCOA DO MEIO	RUA ANTONIO ANDRADE, ENTRE RUA URBANO NETO E AVENIDA MURDO JORGES
CORCOA DO MEIO	RUA DELMIRO GOUVEIA, ENTRE RUA ALAMEDA ALBERTO PANIA E RUA PEDRO MANDARINO
CORCOA DO MEIO	RUA DELMIRO GOUVEIA, ENTRE RUA URBANO NETO E RUA JOSIAS VIEIRA DANTAS
CORCOA DO MEIO	RUA DELMIRO GOUVEIA, ENTRE RUA JOSIAS VIEIRA DANTAS E RUA ALEXANDRE FREIRE BARROS
CORCOA DO MEIO	RUA ANTONIO ANDRADE, ENTRE Nº 1076 E Nº 1054
CORCOA DO MEIO	RUA GILBERTO VIEIRA LEITE, ENTRE RUA DELMIRO GOUVEIA E AV. PROF. JOSE FREITAS DE ANDRADE
CORCOA DO MEIO	RUA FREITAS DE ANDRADE, ENTRE Nº 2559 E Nº 2689
CORCOA DO MEIO	RUA JORN. JOÃO BATISTA SANT'ANNA, ENTRE RUAS ANTONIO INACIOS DOS SANTOS E ALEXANDRE F. BARROS
DOM LUCIANO	RUA A, ENTRE Nº 122 E RUA D
DOM LUCIANO	RUA D, ENTRE RUA N E RUA A
DOM LUCIANO	RUA F, ENTRE RUA A E RUA C
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE RUA C E Nº 25
DOM LUCIANO	RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, ENTRE RUA E E RUA F
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA E RUA N
DOM LUCIANO	RUA D COM RUA ALAGOINHAS
DOM LUCIANO	RUA CAPITÃO MANOEL GOMES, ENTRE RUA ALAGOINHAS E RUA JOSE DE MELO
DOM LUCIANO	RUA ALAGOINHAS COM RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE RUA FRANCISCO DE ASSIS E RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA N, ENTRE RUA E E RUA F - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA F, ENTRE RUA N E Nº 60 - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA D COM AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA B, ENTRE AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO E Nº 61 - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA B, ENTRE Nº 61 E RUA I - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA A, ENTRE AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO E RUA I - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA C, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E Nº 182 - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA C, ENTRE RUA E E RUA F - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA C - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA D, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RUA C - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA F, ENTRE Nº 182 E AVENIDA FREI AUGUSTO SANTANA - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	AVENIDA FREI AUGUSTO SANTANA, ENTRE RUAS F E RUA E - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE AVENIDA FREI AUGUSTO SANTANA Nº 22 - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA D, ENTRE RUA A E RUA F - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA H COM AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA D COM AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA A, ENTRE Nº 82 E RUA B - LOT. MONTE CARLOS
DOM LUCIANO	RUA JOSE DE MELO, ENTRE RUA B E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOT. MONTE CARLOS
DOM LUCIANO	RUA ALAGOINHAS COM RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA ALAGOINHAS E RUA I - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA J, ENTRE RUA E E Nº 29 - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA G1, ENTRE RUA E E Nº 81 - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA F, ENTRE RUA E E Nº 11 - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	TRAVESSA DO COMARCA - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE TRAVESSA D E RUA I - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA L, ENTRE RUA E E Nº 232 - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA L, ENTRE RUA E E RUA P - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA P, ENTRE RUA C E AVENIDA M - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA B COM RUA P - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA C COM RUA P - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA E E RUA D - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA D, ENTRE RUA C E AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. TIA CAÇULA
DOM LUCIANO	RUA E, ENTRE Nº 60 E Nº 26 - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	AVENIDA FREI AUGUSTO DE SANTANA, ENTRE Nº 21 E RUA F - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	AVENIDA FREI AUGUSTO DE SANTANA, ENTRE RUA E E RUA G - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA F E RUA I - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA F COM RUA E - LOT. INDIARA
DOM LUCIANO	RUA D COM RUA E - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA TV COM AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. MOEMA MEIRE
DOM LUCIANO	RUA Z COM AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. MOEMA MEIRE
FAROLÂNDIA	RUA PROMOTOR JOAQUIM VALENÇA, ENTRE AVENIDA CANAL 05 E AVENIDA CANAL 04
FAROLÂNDIA	RUA PROF. NANY DA GLORIA FREIRE, ENTRE RUA PROMOTOR JOAQUIM VALENÇA E Nº 22
FAROLÂNDIA	RUA JOSE CUNHA DE ALCÂNTARA, ENTRE RUAS PROM. JOAQUIM VALENÇA E PROM. JOSE MEDEIROS
FAROLÂNDIA	PROM. JOSE MEDEIROS, ENTRE RUA JOSE CARDOSO ACQUAVIVA E RUA TRÊS
FAROLÂNDIA	RUA JOÃO NELSON DE MELO (SEM SAÍDA) COM RUA MARETA CABRAL DE ANDRADE

FAROLÂNDIA	RUA MARIA DE LIA (SEM SAÍDA) COM AVENIDA MARIA PASTORA
FAROLÂNDIA	RUA JOSE CUNHA DE ALCÂNTARA, ENTRE RUAS PROMOTOR JOSE MEDEIROS E MARIA ADOLFINA COSTA
FAROLÂNDIA	RUA PROF. NANY DA GLORIA FREIRE, ENTRE RUAS RENATO A. MARTINS E PROM. JOAQUIM VALENÇA
FAROLÂNDIA	RUA PROF. RAMUNDO F. SANTOS, ENTRE RUA JOAQUIM VALENÇA E AV. EMP. JOSE CARLOS DA SILVA
FAROLÂNDIA	RUA TENENTE WALDIR DOS SANTOS, ENTRE AVENIDA CANAL 04 E RUA CARLOS PEREIRA MELO
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO GUIMARÃES, ENTRE RUA CARLOS PEREIRA DE MELO E AVENIDA CANAL 04
FAROLÂNDIA	RUA ANTONIO VALENÇA MONTEIRO, ENTRE RUAS MARIA A. COSTA E RUA CLOTILDES DE OLIVEIRA
FAROLÂNDIA	AVENIDA BERA MMR COM AVENIDA MURLO DANTAS
FAROLÂNDIA	RUA CEL. MANOEL RAMOS DOS SANTOS COM RUA MARIA BARROS
FAROLÂNDIA	RUA MANOEL JONAS ANDRADE, ENTRE Nº 222 E Nº 254
FAROLÂNDIA	RUA MARIO DE ANDRADE, Nº 130
FAROLÂNDIA	RUA JOSE CUNHA ALCANTARA, ENTRE RUA EDSON DE OLIVEIRA SANTANA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA TEN. WALDIR DOS SANTOS, ENTRE Nº 439 E Nº 640 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA CEL. MANOEL RAMOS DOS SANTOS COM RUA MARIA BARROS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA TEN. WALDIR DOS SANTOS, ENTRE Nº 639 E Nº 640 - C.J. AUGUSTO FRANCO
GETULIO VARGAS	AVENIDA COELHO E CAMPOS, ENTRE Nº 1377 E Nº 1179
GETULIO VARGAS	AVENIDA GENTIL TAVARES, ENTRE AVENIDA COELHO E CAMPOS E Nº 69
GETULIO VARGAS	AVENIDA SÃO PAULO, ENTRE Nº 1146 E Nº 448
GETULIO VARGAS	TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM, Nº 155
GRAGERU	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, ENTRE AVENIDA ADELIA FRANCO E AVENIDA OVÉDIO TEIXEIRA
GRAGERU	RUA RAFAEL RODRIGUES, ENTRE Nº 83 E AVENIDA ADELIA FRANCO
INACIO BARBOSA	AVENIDA PANTANAL, ENTRE Nº 158 E Nº 191
INACIO BARBOSA	RUA ALBERTO DAS GALVÃO, ENTRE RUA JOURNAL ANDRADE E Nº 82
INACIO BARBOSA	RUA JOURN. ANDRADE, ENTRE Nº 364 E RUA ALBERTO DAS GALVÃO
INACIO BARBOSA	RUA BOSCO SCAFFS, ENTRE RUA JOURN. ANDRADE E Nº 84
INACIO BARBOSA	RUA JORN. FERNANDO SAVIO, ENTRE Nº 311 E Nº 263
INACIO BARBOSA	RUA VA FERREIRA, ENTRE AVENIDA ETELVINO ALVES E Nº 260
INACIO BARBOSA	AVENIDA QUIRNO, ENTRE AVENIDA ETELVINO ALVES E Nº 1300
INDUSTRIAL	RUA VER. JOÃO MENEZES DE OLIVEIRA, ENTRE RUA JOÃO MARCOS E Nº 61 - C.J. JOÃO PAULO
INDUSTRIAL	RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA, ENTRE RUA MANOEL SATIRO DE MENEZES E AV. CORINTHO LEITE
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA 2, ENTRE RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA E Nº 278
INDUSTRIAL	AVENIDA CORINTHO LEITE, ENTRE RUA FORTALEZA E RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA
INDUSTRIAL	RUA BATISTINA, ENTRE AVENIDA ASSIS XAVIER E TRAVESSA ARACAUZINHO
INDUSTRIAL	TRAVESSA ARACAUZINHO, ENTRE RUA BATISTINA E AVENIDA FLADELFO DOREA
INDUSTRIAL	AVENIDA CORINTHO LEITE, ENTRE RUA BATISTINA E RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE AVENIDA ALAMIRA E RUA 3
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE RUA 3 E RUA RECANTO DOS PASSAROS
INDUSTRIAL	AVENIDA SIAOJÁ SOBRAL, ENTRE AVENIDA ARTON TELES E AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU
INDUSTRIAL	AVENIDA TANCREDO CAMPOS, ENTRE RUA RECANTO DOS PASSAROS E AV. EUCLEDES FIGUEIREDO
INDUSTRIAL	RUA FORTALEZA, AVENIDA CORINTHO LEITE E AVENIDA TANCREDO CAMPOS
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA, ENTRE AVENIDA GEN. CALAZANS E AVENIDA TANCREDO CAMPOS
INDUSTRIAL	RUA CURITIBA, ENTRE AVENIDA TANCREDO CAMPOS E RUA MARCELINO PROCOPIO DA SILVA
JABOTIANA	RUA TRÊS, ENTRE RUA ANDRADE, Nº 552 - C.J. JK
JABOTIANA	RUA JOÃO GENITON DA COSTA, ENTRE RUA PROJETA DA 02 E AVENIDA TANCREDO NEVES
JABOTIANA	RUA POETA ROBERTO MOZART, ENTRE RUAS ANTONIO N. RODRIGUES E PROF. JOSE ANTONIO C. MELO
JABOTIANA	RUA ANTONIO NASCIMENTO RODRIGUES, ENTRE RUA PROF. FRANCO FREIRE E Nº 189 - C.J. JK
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, ENTRE Nº 493 E Nº 479
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, ENTRE Nº 493 E Nº 479
JAPÃOZINHO	RUA B, ENTRE RUA SÃO CARLOS E Nº 16
JAPÃOZINHO	ACESSO AO CONDOMÍNIO JAMÉ ROBERTO
JARDINS	AVENIDA DEP. SILVIO TEIXEIRA, Nº 1157
JARDINS	ALAMEDA ESPANHA, ENTRE AVENIDA OVÉDIO TEIXEIRA E ALAMEDA ALEMANNHA
JARDINS	RUA CARLOS ALBERTO C. TOURINHO, ENTRE RUA JOSE C. PINTO E AV. PEDRO VALADARES
JARDINS	RUA JOSE SEABRA BATISTA, ENTRE RUA CARLOS ALBERTO C. TOURINHO E AV. JORN. SANTOS SANTANA
LUZA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES, ENTRE AV. FRANCISCO PORTO E RUA MAYE BELL TAYLOR
LUZA	RUA SAUS MANOEL DE JESUS, ENTRE Nº 115 E AVENIDA AUGUSTO FRANCO
LUZA	RUA OSVALDINA ROCHA ROSA, ENTRE Nº 98 E Nº 24
LUZA	RUA MAYE BELL TAYLOR, ENTRE AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE E RUA ENG. ANTONIO G. SOARES
LUZA	RUA WOLNEY SILVA, ENTRE Nº 320 E Nº 300 - C.J. MEDICI
LUZA	RUA MOACYR LOPES PACONE, ENTRE RUAS DR. MANOEL CANDIDO PEREIRA E LUIZ CORDEIRO MORAIS
LUZA	RUA LUIZ CORDEIRO DE MORAIS, ENTRE RUA MOACYR LOPES PACONE E AVENIDA HERMES FONTES
LUZA	RUA RUA MANS. NELSON HUNGRIA, Nº 51
MOSQUEIRO	AVENIDA DR. JOSE DOMINGOS MNA, ENTRE RODOVA DOS NAUFRAGOS E Nº 1385
MOSQUEIRO	AVENIDA DR. JOSE DOMINGOS MNA, ENTRE Nº 1385 E Nº 688
MOSQUEIRO	RODOVA PROF. EDUARDO CABRAL MENEZES, ENTRE Nº 1313 E Nº 2389
MOSQUEIRO	AVENIDA DR. JOSE DOMINGOS MNA, ENTRE TRAVESSA SÃO JOSE E Nº 721
MOSQUEIRO	AVENIDA DR. JOSE DOMINGOS MNA, ENTRE AVENIDA NACIO BARBOSA E Nº 580
NOVO PARAISSO	RUA DEP. EUDALDO DINIZ, Nº 391
OLARIA	AVENIDA OLIVIANA, SOUZA NEVY, ENTRE TRAVESSA CANAL E Nº 227
PEREIRA LOBO	RUA SÃO JUDAS TADEU, ENTRE AVENIDA AUGUSTO FRANCO E RUA PONTO VERDE
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, ENTRE Nº 43 E Nº 55
PONTO NOVO	AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES COM RUA JURANDIR GOMES DE SANTANA
PONTO NOVO	RUA JURANDIR GOMES DE SANTANA, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, ENTRE AVENIDA NESTOR SAMPAIO E AVENIDA TANCREDO NEVES
PONTO NOVO	RUA DOM JESUS DOS NAUFRAGOS, Nº 315
PONTO NOVO	RUA SANTA BERBATEDE, ENTRE AV. PADRE NESTOR SAMPAIO E RUA CARLOS MARQUES
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, ENTRE Nº 2500 E Nº 2685
PONTO NOVO	PRAÇA SANTIAGO DANTAS, PRINCESA ISABEL E MARIO VILAS BOAS
PONTO NOVO	PRAÇA DOM MARIO VILAS BOAS
PONTO NOVO	RUA GENES BARRETO MOURA, ENTRE Nº 108 E Nº 78
PONTO NOVO	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE PONTE DO DETRAN E O ATACADÃO
PONTO NOVO	AVENIDA DR. ARTON TELES, ENTRE AVENIDA SIAOJÁ SOBRAL E AVENIDA JOÃO RIBEIRO
PONTO NOVO	PRAÇA DOM MARIO VILAS BOAS, ENTRE TV. CEL. LEÃO VIANA E RUA MANOEL MADUREIRA
PORTO DANTAS	RUA ANTONIO DOS SANTOS, ENTRE Nº 498 E Nº 680
PORTO DANTAS	RUA ANTONIO DOS SANTOS, ENTRE O Nº 621 E RUA G
PORTO DANTAS	RUA C, ENTRE RUA ANTONIO DOS SANTOS E O Nº 98
PORTO DANTAS	RUA PEDRA MOLE, ENTRE RUA ALZIRA REZENDE E O Nº 173
PORTO DANTAS	AVENIDA ENG. EUCLEDES FIGUEIREDO, ENTRE AVENIDA TANCREDO CAMPOS E RUA IRMÃ DULCE
PORTO DANTAS	AVENIDA ENG. EUCLEDES FIGUEIREDO, ENTRE RUA IRMÃ DULCE E RUA 3
SANTO ANTONIO	RUA MONSENHOR CARLOS COSTA, ENTRE RUA MURBECA E RUA EDMILSON SOUZA
SANTO ANTONIO	RUA EDMILSON SOUZA, ENTRE RUA MONSENHOR CARLOS COSTA E RUA SÃO FRANCISCO
SANTO ANTONIO	RUA SÃO FRANCISCO, ENTRE RUA EDMILSON SOUZA E RUA SANTA MARIA
SANTO ANTONIO	RUA SANTA MARIA, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO E Nº 59
SANTO ANTONIO	AVENIDA DR. ARTON TELES, ENTRE RUA SRIE E Nº 892
SANTO ANTONIO	TRAVESSA SÃO FRANCISCO, Nº 21
SANTOS DUMONT	TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MARACAJU
SANTOS DUMONT	RUA JOSE NOVAS, ENTRE Nº 315 E Nº 300
SANTOS DUMONT	AVENIDA ARTON BERNI, ENTRE AVENIDA MARANHÃO E Nº 888
SANTOS DUMONT	AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO, ENTRE Nº 259 E Nº 464
SÃO CONRADO	RUA 96, ENTRE RUA ZOROASTRO RODRIGUES SANTOS E Nº 198 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	RUA A 9, ENTRE Nº 198 E Nº 286 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO CONRADO	AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, Nº 4218 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	RUA CAMPOS DO BRITO, ENTRE Nº 675 E Nº 1177
SIQUEIRA CAMPOS	RUA JOSE JORGE DE SIQUEIRA FILHO, Nº 109 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CONSTANÇO GOMES DE SOUZA, Nº 15 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ARMANDO FONTES, Nº 87 - C.J. COSTA E SILVA
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA POETA JOSE SAMPAIO, ENTRE RUA ACRE E Nº 505
SIQUEIRA CAMPOS	TRAVESSA AMAPA COM RUA ACRE
SIQUEIRA CAMPOS	AVENIDA MARANHÃO COM HOSPITAL NESTOR PIVA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE RUA SANTA CATARINA E RUA ALAGOAS
SIQUEIRA CAMPOS	RUA PRADIA, ENTRE RUA ALAGOAS E RUA SANTA CATARINA
SIQUEIRA CAMPOS	RUA FREI LUIZ CAVOLI DE NORONHA, ENTRE RUA ACRE E Nº 97
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO E RUA H - LOT. ROSA DO SOL
SOLEDADE	RUA B, ENTRE RUA C E AVENIDA CARLOS MARQUES - LOT. ISABEL MARTINS
SOLEDADE	AVENIDA A, ENTRE RUA E E AVENIDA EUCLEDES FIGUEIREDO - LOT. ROSA DO SOL
SOLEDADE	RUA F, ENTRE RUA DÓS CRAVOS E RUA O - LOT. ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA C, ENTRE RUA P E RUA D - LOT. ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA DO TÔQUE, ENTRE AVENIDA J E RUA F - LOT. ISABEL MARTINS
SOLEDADE	RUA E, ENTRE RUA G E Nº 09 - LOT. ISABEL MARTINS
SUISSA	RUA RIBEIROPOLIS, ENTRE Nº 1455 E AVENIDA AUGUSTO FRANCO
SUISSA	RUA LEONEL CURVELO, ENTRE Nº 867 E Nº 868

Tapa-buraco total: 23.429,79 m²

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Drenagem pluvial

[illegible][illegible][illegible]

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Pavimentação / Recapeamento asfáltico

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Edelzio Vieira de Melo	São José	2.083,33	200,00
02	Largo Carro Quebrado	São José	2.187,50	210,00
03	Av. Gonçalo Prado Rollemberg	São José	1.041,67	100,00
04	Rua "H"	Soledade	208,33	20,00
05	Av. Santos Dumont	Coroa do Meio	6.208,33	596,00
TOTAL GERAL			11.729,17	1.126,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	3.509,00
02	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	20,00
TOTAL (t)			3.529,00

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Terraplenagem / Patrolamento

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
AREIA BRANCA	RUA ANISIO SANTANA	PATROLAMENTO
AREIA BRANCA	RUA ALBERTO DIAS DE MATOS	PATROLAMENTO
CENTRO	TERMINAL DE INTEGRAÇÃO	TERRAPLANAGEM
COROA DO MEIO	RUA ANTÔNIO MAIA	ABERTURA DE ACESSO EM TERRENO DA PF
COROA DO MEIO	ACESSO AO TERRENO DA POLÍCIA FEDERAL	PATROLAMENTO
DOM LUCIANO	RUA "A"	RETIRADA DE BORRACHUDOS
DOM LUCIANO	RUA "I"	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	RUA "D", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	RUA "J", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLANAGEM
DOM LUCIANO	RUA "A", LOTEAMENTO TIA CAÇULA	TERRAPLANAGEM
JOSÉ C. DE ARAÚJO	AVENIDA MARANHÃO	PATROLAMENTO EM ÁREA DE FEIRA
MOSQUEIRO	RUA TANGA VOOU	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	TRAVESSA IÉDA	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA ÁRLINTON	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	TRAVESSA OSEAS SIMEÃO DOS REIS	PATROLAMENTO
MOSQUEIRO	RUA "G"	PATROLAMENTO
PONTO NOVO	AVENIDA AUGUSTO FRANCO	RECUPERAÇÃO DE BASE
ROBALO	RUA JOÃO MENEZES	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA CURVA DO RIO	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA OURO VERDE	PATROLAMENTO
ROBALO	RUA JOÃO MENEZES	PATROLAMENTO
SANTA MARIA	AVENIDA "C", LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL	TERRAPLANAGEM
SIQUEIRA CAMPOS	ESTÁDIO JOÃO HORA DE OLIVEIRA	TERRAPLANAGEM
SOLEDADE	RUAS DO LOTEAMENTO PORTO DO GRINGO	PATROLAMENTO
SOLEDADE	AVENIDA "J", LOTEAMENTO ISABEL MARTINS	TERRAPLANAGEM

Desobstrução

Jabotiana	Estrada da Cabrita, Nº 888.
Japãozinho	Rua "B".
Japãozinho	Travessa"B".
José C. de Araújo	Rua Barra dos Coqueiros, Nº 26.
Mosqueiro	Rua "C", Nº 48, Loteamento Jardim Atalaia.
Olaria	Avenida Matadouro, Nº 256, loteamento Nova Liberdade.
Olaria	Rua Alexandre Bispo de Andrade, Nº 179.
Ponto Novo	Rua Massaranduba, Nº 25.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 01, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 02, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Alfredo Lucas, Nº 05, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Sede EMURB - Avenida Augusto Franco, Nº 3340.
Ponto Novo	Rua Dom Pedro I, Nº 49.
Salgado Filho	Rua Urquiza Leal, Nº 538.
Santa Maria	Rua Vale do Amanhecer, Nº 102, Terra Dura.
Santos Dumont	Rua General Prado esquina com Rua Iralina Bonfim.
Santos Dumont	Rua Roberto de Moraes, Nº 195.
São Conrado	Rua Manoel Nunes, Nº 62.
São Conrado	Avenida Gasoduto, Nº 1052, Conjunto Orlando Dantas.
Soledade	Rua A-1 , Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua B-1 , Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "B", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "D", Loteamento Jardim Bahia .
Soledade	Rua "I" , Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "J" , Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "L" , Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "M" , Loteamento Jardim Bahia.
Soledade	Rua "B", Nº 313, Loteamento Rosa do Sol.
Soledade	Rua "J", Nº 33, Loteamento Isabel Martins.
Soledade	Rua "A", Nº 129, Loteamento Tia Caçula.
Soledade	Rua "A", Nº 130, Loteamento Tia Caçula.
Soledade	Travessa "M". Nº 20, Loteamento Isabel Martins.

Luiza	Rua Paulo Teixeira Guimarães, Nº 30, Conjunto Presidente Medici II
Margarita	Rua "P", Nº 125, Loteamento Prata do Refúgio.
Mosqueiro	Favessa "29", Nº 38, Loteamento Santa Maria.
Mosqueiro	EMEF Elias Morabito.
Mosqueiro	EMEF Santa Montoliva.
Nevo Pastorio	Rua José Emílio da Costa, Nº 413.
Nevo Pastorio	Rua José Emílio da Costa, Nº 425.
Olaria	Rua "N", Nº 365.
Olaria	Rua "P", Nº 504, Loteamento Nova Liberdade II.
Olaria	Rua "TV", Nº 45, Conjunto Maria do Carmo II.
Olaria	Rua "3", Nº 45, Conjunto Maria do Carmo II.
Olaria	Rua "15a Metá Metá do Prado", Nº 213, São Carlos.
Olaria	Rua Alexandre Bessa de Andrade, Nº 179.
Olaria	Rua "14", Conjunto Maria do Carmo.
Olaria	Favessa "17", São Carlos.
Olaria	Rua "14", Nº 100, Conjunto Maria do Carmo.
Olaria	Rua "45", Nº 45, Conjunto Maria do Carmo.
Olaria	Rua "N", Nº 125, Loteamento Nova Liberdade I.
Ponto Novo	Rua Coronel João Gonçalves, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Messianópolis, Nº 25.
Ponto Novo	Rua Senhor dos Passos, Nº 251.
Ponto Novo	Rua Coronel Miguel de Almeida, Nº 209, Conjunto Castelo Branco.
Ponto Novo	Rua Bom Jesus das Neves, Nº 587.
Ponto Novo	Rua Coronel José Meneses Filho, Nº 30.
Ponto Novo	Avencida Acláris Garças, Nº 28.
Robalo	Rodovia Prof. Eduardo de Cással Ribeiro, Nº 1805, Povoado São José.
Robalo	Rua "P", Nº 125, Loteamento Prata do Refúgio.
Robalo	Rua Manoel Joventino Garças, Nº 68, Povoado São José.
Robalo	Rodovia Prof. Carlos Cardal Meneses, Nº 1101, Povoado São José.
Robalo	EMEF Prof. Maria Euzébia De Melo, Rua de Igreja, Nº 1999, Povoado São José.
Robalo	Rua "P", Nº 164, Loteamento Prata do Refúgio.
Robalo	Favessa Curva do Rio, Nº 202.
Robalo	Rua "TV", Nº 29, Loteamento Solares, Povoado São José.
Salgado Filho	Rua Eudides Pires Mendonça, Nº 626.
Santa Maria	Rua Santa Helena, Nº 24.
Santa Maria	Rua Vicente, Nº 356, Loteamento Marian.
Santa Maria	Rua "14", Nº 91, Loteamento Santa Maria.
Santa Maria	Rua "14", Nº 91, Loteamento Santa Maria.
Santa Maria	Rua "20", Nº 64, Conjunto Padre Pedro.
Santa Maria	Rua "TV", Nº 68.
Santa Antonio	Rua Maria Isabel Oliveira, Nº 153.
Santos Dumont	Rua Bela Vista, Nº 122.
Santos Dumont	Favessa Mesquita Branca, Nº 48.
Santos Dumont	Rua Láz. George, Nº 895.
Santos Dumont	Rua Jonalbo Bonfim, Nº 315.
São Corrado	Rua NBI, Nº 41.
São Corrado	Rua Monor Menes, Conjunto Orlando Dantas.
São Corrado	Rua "2ª etapa com Rua Franca "2"
São Corrado	Rua Monor Menes, Nº 117, Conjunto Orlando Dantas.
São José	Praça Tobias Barreto, lagoa dos pinos.
Solidade	Rua "G", Nº 129, Loteamento Manoel Belo.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação de conjuntos sinalizadores e placas de parede

- Conjuntos sinalizadores e Placas de parede para as Ruas Conjunto Residencial Jornalista Orlando Dantas (1ª Parte);
- Conjuntos sinalizadores e Placas de parede para as Ruas Conjunto Residencial Costa e Silva.



FOTO 01 – RUA JAIME ARAÚJO.



FOTO 02 – RUA JAIME ARAÚJO.



FOTO 10 – RUA DOS MODERNISTAS.



FOTO 03 – RUA GIVALDO DIONÍZIO DOS SANTOS.



FOTO 04 – RUA GIVALDO DIONÍZIO DOS SANTOS.



FOTOS 05 – RUA GENERAL JOÃO AUGUSTO.



FOTO 06 – RENATO BARRETO.



FOTO 11 – RUA CARLOS GARCIA.



FOTO 12 – RUA ARMANDO FONTES.



Em maio de 2018, a Prefeitura de Aracaju retomou a revisão do PDDU, sob a liderança da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Após uma série de estudos, reuniões, relatórios, visitas técnicas e discussões, o trabalho foi disponibilizado para que a população pudesse acessar pelo endereço eletrônico www.aracaju.se.gov.br/pddu/. Até o dia 15 de outubro, qualquer cidadão pode conferir o anteprojeto completo, junto aos mapas e anexos, e contribuir com sugestões.

■ Consulta pública disponível no site da PMA



Conheça o Projeto do novo PDDU

Conheça o projeto aqui e dê a sua opinião.

- [Minuta Revisão Plano Diretor de Desenvolvimento de Aracaju](#)
- [ANEXO I - Definições](#)
- [ANEXO II - Mapa do Macrozoneamento](#)
- [ANEXO III - Quadro da Delimitação de Zonas](#)
- [ANEXO IV - Quadro de critérios de ocupação do solo](#)
- [ANEXO V - Mapa AIU](#)
- [ANEXO VI - Quadro de Diretrizes AIU](#)
- [ANEXO VII - Mapa AIA](#)
- [ANEXO VIII - Quadro de diretrizes AIA](#)
- [ANEXO IX - Mapa das Áreas de Interesse Social](#)
- [ANEXO X - Quadro Áreas Especiais de Interesse Social](#)
- [ANEXO XI - Diretrizes da AESPA](#)
- [ANEXO XII - Sistema Viário](#)
- [ANEXO XII - A.B.C.D. Perfis Viários](#)
- [ANEXO XIII - Quadro de vagas de Estacionamento](#)
- [ANEXO XIV - Bens de Patrimônio](#)
- [ANEXO XV - Mapa de Paisagens Notáveis](#)

Oito audiências públicas foram iniciadas no mês de setembro, obedecendo o seguinte cronograma:

■ Cronograma das Audiências Públicas

Audiência	Local	Horário	Bairros de abrangência
1ª 21/09/2021	Colégio Estadual Gov. Augusto Franco – Rua Jackson Figueiredo, nº 49, Bairro Santos Dumont	18h30 às 21h30	Santos Dumont, Soledade, Dom Luciano, José Conrado de Araújo, Cidade Nova Lamarão e Japãozinho
2ª 23/09/2021	EMEF Dom José Vicente Távora – Rua Manoel Preto, nº 26, Bairro Santo Antônio	18h30 às 21h30	Santo Antônio, Dezoito do Forte, Palestina, Industrial, Centro, Getúlio Vargas e Porto Dantas
3ª 28/09/2021	EMEF Teixeira Lott – Rua Nova Paraíba, nº 600, Bairro América	18h30 às 21h30	Siqueira Campos, Cirurgia, Suíça, Pereira Lobo, Novo Paraíso e América
4ª 30/09/2021	Sede da EMURB – Avenida Augusto Franco, nº 3340, Bairro Ponto Novo	18h30 às 21h30	Luzia, Jabotiana, Grageru, Ponto Novo e Inácio Barbosa
5ª 05/10/2021	EMEF Anísio Teixeira – Avenida Monteiro Lobato, nº 381 – Bairro Atalaia	18h30 às 21h30	Aeroporto, São Conrado, Santa Maria, Coroa do Meio, Atalaia, Aruana, 17 de Março e Farolândia
6ª 07/10/2021	EMEF Manoel Bonfim – Rua Geny da Silva Dias, nº 480, Bairro Bugio	18h30 às 21h30	Bugio, Olaria, Jardim Centenário e Capucho
7ª 13/10/2021	Colégio Estadual Atheneu Sergipense – Rua Riachuelo, s/n, Bairro São José	18h30 às 21h30	São José, Jardins, Salgado Filho e Treze de Julho
8ª 14/10/2021	EMEF Prof. Florentino Meneses – Rod. Ecologista Chico Mendes, 1847, Bairro Areia Branca	18h30 às 21h30	Areia Branca, Mosqueiro, Matapoá, Gameleira, São José dos Naufragos e Robalo



1. Implantação da Rua Dr. José Augusto Barreto - Bairro Coroa do Meio
2. Revitalização da Praça Jaime Araújo Andrade - Bairro José Conrado de Araújo
3. Revitalização da Praça João de Menezes Barros Filho - Bairro Olaria
4. Infraestrutura da Rua Evaldo Alcides Pereira - Bairro Jardins
5. Implantação da Av. Dr. José Machado de Souza - Bairro Jardins

DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.


- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA

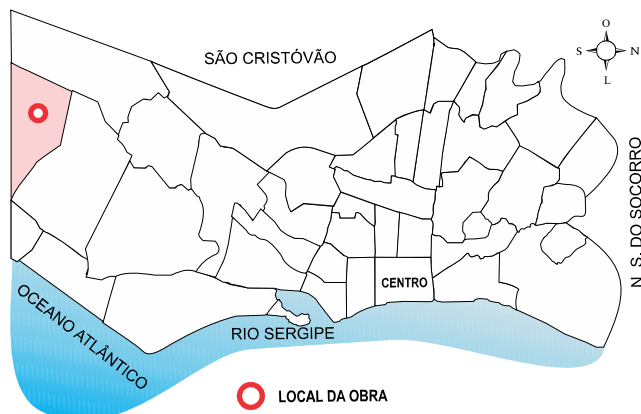

OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração

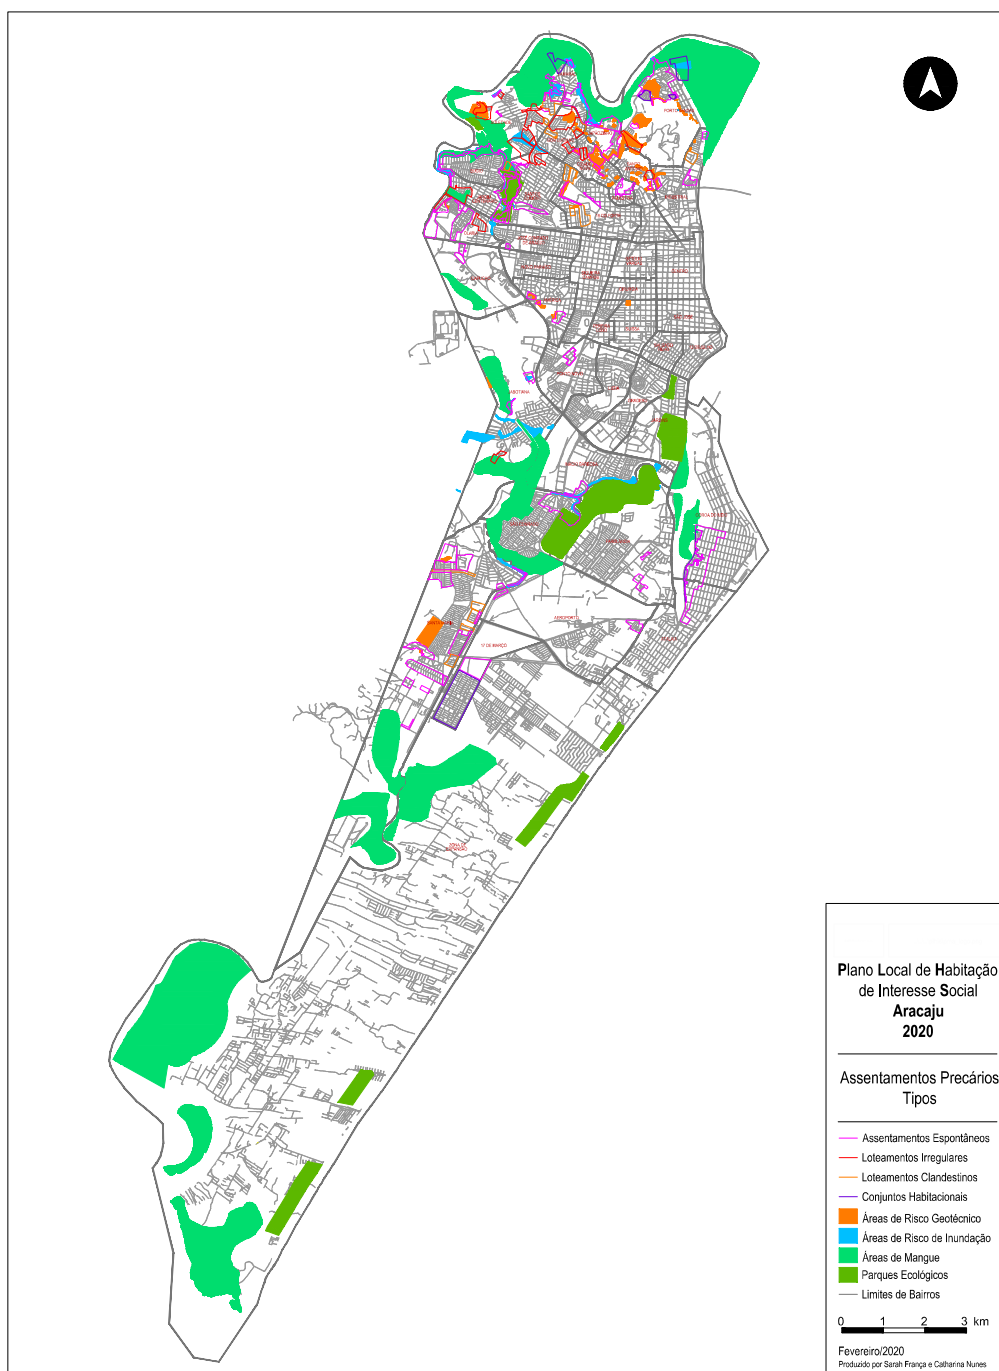

ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

FASES DA PPP

- A PPP foi modelada em 4 fases:

Fase 0

Esta fase iniciou-se em 02/02/2021, a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). Ela já foi finalizada com as etapas cumpridas, conforme o contrato.

Após a eficácia do contrato, a concessionária iniciou sua mobilização para cumprimento das metas contratuais. Instalou-se em imóvel situado na avenida Augusto Franco, nº 2500, bairro Ponto Novo, onde implantou a sede do seu escritório central e o Centro de Controle Operacional (CCO).

Dentre as principais atividades executadas nesta fase destacam-se:

- Recadastramento do Parque de IP - Durante a modelagem da PPP, a previsão foi de 58.700 pontos de iluminação na cidade. Após um rigoroso recadastramento georreferenciado dos postes, braços, lâmpadas e vias do município, foram recadastrados 59.500 pontos do Parque de IP.
- Planos de Operação e Manutenção - Os Planos de Operação e Manutenção foram criados de acordo o que preconiza o contrato da PPP e aprovados pela gestão do contrato dentro dos prazos estipulados.

FASES DA PPP

Fase I

Com o término da Fase 0 e início da Fase I, no mês de junho, deu-se a assunção do Parque de IP pela concessionária. Ela começou a operar, fazendo a manutenção do Parque de IP, colocando em prática os planos de operação e manutenção.

Nesta fase foi elaborado o Plano de Modernização da iluminação pública e aprovado no início do mês de agosto. Esse plano inclui:

- Estudos luminotécnicos para a troca de luminárias por led. O estudo indicou qual tipo de lâmpada e potência são adequadas para cada local, de forma que se tenha uma iluminação uniforme na cidade.
- Plano para o sistema de telegestão, que será implantado em torno de 30% das vias da cidade;
- Plano de Iluminação Especial em 16 pontos turísticos e/ou monumentos, pré-determinados pela Prefeitura de Aracaju.

A concessionária implantou canais de comunicação para atender as demandas da população dos serviços da iluminação pública. Foi implantado um *call center* (0800 002 1743), disponível 24h, todos os dias da semana; o aplicativo Conecta Aracaju (disponível para download gratuito na PlayStore). Outros meios para informar eventuais problemas com a iluminação pública é o portal Conecta Aracaju Cidade Iluminada e o ponto fixo de atendimento, localizado na sede da Conecta.

FASES DA PPP

Fase II

Esta é a fase inicial da modernização do Parque de IP, que começou no mês de agosto e deverá ser concluída no mês de fevereiro/2023 (18 meses).

Dentre as principais atividades, destacam-se:

- Substituição das luminárias existentes por Luminárias de LED. No dia 10 de agosto, foi iniciada a substituição das lâmpadas existentes pelas de LED na avenida Poço do Mero, no bairro Bugio.
- Implantação da Iluminação Especial;
- Implantação do Sistema de Telegestão.

A concessionária pretende antecipar o prazo da modernização do Parque de IP em 6 meses, passando este prazo de 18 para 12 meses.

Além dos serviços acima descritos, nesta fase também iniciam os serviços de extensão de rede (implantação de postes, rede de energia e luminárias para atendimento ao sistema de iluminação pública do município) e a continuidade dos serviços de operação e manutenção do Parque de IP.

FASES DA PPP

Fase III

Esta fase terá início no mês de fevereiro/2023 e será concluída em fevereiro/2034 (11 anos).

Esta é a fase do término da modernização, prevista para acontecer no início do mês de fevereiro de 2023.

Nesta fase o Parque de IP do município de Aracaju estará modernizado e a concessionária continuará a prestação dos serviços de operação e manutenção do Parque e a implantação das extensões de rede.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), é a responsável por gerir o contrato da iluminação pública de Aracaju.

Todo o trabalho desenvolvido pela Conecta Aracaju é fiscalizado pela equipe técnica da Emurb, que fiscaliza o contrato, além da empresa Accenture, verificador independente contratado para monitorar e controlar o desempenho do projeto. Ela já está atuando desde a etapa do cadastramento dos pontos de iluminação e vai acompanhar toda a modernização do parque de iluminação da cidade.

FASES DA PPP

■ CRONOGRAMA DAS FASES

Nº	FASE			SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
	INICIO	FIM	PRAZO (+/-)	
0	02/02/2021	06/2021	120 dias	*Setup do PPP *Planos de Manutenção e Operação *Cadastro do Parque de IP
I	06/2021	08/2021	60 dias	*Assunção do Parque de IP para Manutenção, Operação *Plano de Modernização (incluindo os projetos)
II	08/2021	02/2023	18 meses	*Modernização do Parque de IP *Implantação dos locais de Iluminação Especial *Implantação da Telegestão *Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP
III	02/2023	02/02/2034	11 anos	*Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP



PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Realizados 2.786 atendimentos no mês de setembro.

STATUS DO CONTRATO DA PPP

Manutenção do Parque de IP - SETEMBRO/2021

1. Atendimentos

1.1 Realizados

Atendido	1876
Encontrado normal	29
Fora do escopo do contrato	13
Impossibilidade	16
Não Identificado	1
Outro atendimento	1
MOD: atendido	840
Repetido	10
Total	2786

1.2 Por origem de ocorrência

App	214
Call Center	785
Internet	15
Ronda própria	1.772
Total	2786



STATUS DO CONTRATO DA PPP

Modernização do Parque de IP - SETEMBRO/2021

Locais	QUANT
Bairro Bugio	496
Bairro 17 de Março	304
Av. Beira Mar	246
TOTAL	1046



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom
